

Lokalbehovsplan 2027–36 -med utblicktill 2040

-Underlag till Lokalförsörjningsplan 2027–2036



Visualisering för Westerlundska gymnasiet

Ärendenummer: UN2025/956

Datum: 2026-02-25

Utbildningsförvaltningen (UF)

Maria Jacobsson och Pernilla Blom

Lokalsamordnare

Maria.jacobsson@enkoping.se och Pernilla.blom@enkoping.se

Innehåll

1. Sammanfattning	6
2. Inledning.....	8
2.1 Syfte och lokalprocess.....	8
2.1.1 Lokalplanering.....	10
2.2 Förutsättningar – uppdrag och styrning	11
2.2.1 Kommunens övergripande mål	12
1.1.1 Enköpings vision 2030	12
1.1.2 2.2.2 Utbildningsnämnden.....	13
1.1.3 2.2.3 Lagar	14
2.3 Befolkningsprognos och historiskt utfall.....	15
1.2.1 2.3.1 Kommunprognosen	15
1.2.2 2.3.2 Barnprognos och elevprognos	16
2.4 Översiktsplan	17
2.5 Energimål.....	18
2 3. Förskola.....	19
2.1 3.1 Nuläge.....	19
2.1.1 3.1.1 Kapacitet	20
2.1.2 3.1.2 Sök mönster	21
2.1.3 3.1.3 Befolkningsutveckling.....	23
2.2 3.2 Verksamheter och lokaler – per område	25
2.2.1 3.2.1 Bergvretens placeringsområde	25
2.2.2 3.2.2 Enögla placeringsområde.....	28
2.2.3 3.2.3 Fjärdhundra placeringsområde	31
2.2.4 Inga planerade förändringar 3.2.4 Grillby placeringsområde.....	32
2.2.5 3.2.5 Hummelsta placeringsområde.....	33
2.2.6 3.2.6 Korsängens placeringsområde.....	35
2.2.7 3.2.7 Lillkyrka placeringsområde	37
2.2.8 3.2.8 Munksundets placeringsområde	39
2.2.9 3.2.9 Romberga placeringsområde	41
2.2.10 3.2.10 Skolsta placeringsområde	43
2.2.11 3.2.11 Örsundsbro placeringsområde	44

2.3	3.3 Framtida utveckling.....	47
2.3.1	3.3.1 Planerade och beslutade projekt.....	48
2.3.2	3.3.2 Framtida möjliga projekt.....	48
3	4. Grundskola.....	50
3.1	4.1 Nuläge.....	50
3.1.1	4.1.1 Kapacitet	51
3.1.2	4.1.2 Sökmönster	52
3.1.3	4.1.3 Befolkningsutveckling för elever 6–15 år.....	53
3.2	4.2 Verksamheter och lokaler – per område	55
3.2.1	4.2.1 Bergvretens placeringsområde	55
3.2.2	4.2.2 Enögla placeringsområde (lokaliserad i gamla Västerledsskolans lokaler).....	56
3.2.3	4.3.3 Fjärdhundra placeringsområde	58
3.2.4	4.2.4 Grillby placeringsområde.....	59
3.2.5	4.2.5 Hummelsta placeringsområde.....	60
3.2.6	4.2.6 Korsängens placeringsområde.....	62
3.2.7	4.2.7 Lillkyrka placeringsområde.....	63
3.2.8	4.2.8 Munksundets placeringsområde	65
3.2.9	4.2.9 Romberga placeringsområde	66
3.2.10	4.2.10 Skolsta placeringsområde	68
3.2.11	4.2.11 S:t Ilians placeringsområde	70
3.2.12	4.2.12 Örsundsbro placeringsområde	71
3.2.13	4.2.13 Anpassad grundskola	72
3.3	4.3 Framtida utveckling.....	74
3.3.1	4.3.2 Planerade och beslutade projekt.....	75
3.3.2	4.3.3 Framtida möjliga projekt.....	76
4	5. Gymnasium	77
4.1	5.1 Nuläge.....	77
4.1.1	5.1.1 Kapacitet	78
4.1.2	5.1.2 Sökmönster	79
4.1.3	5.1.3 Befolkningsutveckling för elever 16 – 19 år.....	79
4.2	5.2 Verksamheter och lokaler	80
4.3	5.3 Framtida utveckling.....	81
5	6. Vuxenutbildningen	82

5.1	6.1 Nuläge.....	82
5.1.1	6.1.1 Kapacitet	82
5.1.2	6.1.3 Befolkningsutveckling.....	82
5.2	6.2 Verksamheter och lokaler	82
5.2.1	6.2.1 Komvux	82
5.2.2	6.2.2 Yrkeshögskola	83
5.2.3	6.2.3 Integrationsenheten.....	83
5.3	6.3 Framtida utveckling.....	83
6	7. Förslag till Lokalbehovsplan - Sammanvägd behovsbedömning.....	84
6.1	7.1 Åtgärdsförslag till Investeringsplan 2027–2036	85
6.1.1	7.1.1 Projekt efter investeringsplanens slut.....	86
6.2	7.2 Troliga uppsägningar i samband med lokalförändringar	86
7	8 Ekonomiska och sociala konsekvenser.....	88
7.1	8.1 Samverkansmöjligheter	88
7.2	8.2 Konsekvenser om föreslagna investeringar inte prioriteras	89
7.2.1	8.2.1 Förskola.....	89
7.2.2	8.2.2 Grundskola	89
7.3	8.2.3 Prioriteringar	90
8	Bilaga Möjliga besparingsåtgärder med konsekvensanalys....	91
9	Bilaga Markbehovsplan för utbildningsnämndens lokalförsörjning	92

1. Sammanfattning

Årets lokalbehovsplan baserar sig precis som tidigare på verksamheternas behov, befolkningsprognos, omvärldsanalys samt lokalernas skick och kapacitet.

Vi ser att befolkningsprognosen är ganska oförändrad mot förra året därför har endast mindre ändringar skett i form av förskjutning av färdigställandedatum.

Under 2026 kommer följande projekt stå klara för inflytt:

Ripans förskolan

Storskogens förskola

Lillsidanskolan med aktivitetscenter

Nyborg C hus.

I Investeringsplanen 2027-2036 planeras följande projekt:

Salneckes förskola renovering (2028)

Enögla förskola (2030)

Skolsta förskola (2030)

Örsundsbroskolan (2027)

Bergvreten kök/matsal samt nybyggnation (2027/2029)

Kapacitetsökning för Hummelstaskolan finns kvar men med förskjutna datum. (Paviljonger 2030, Ombyggnation 2032)

Efter investeringsperiodens slut finns följande projekt:

Rosens förskola (2037)

Enens förskola (2040)

Tallens fsk (2043)

Ny grundskola (2040)

Notera att prioritering mellan nämndernas åtgärdsförslag sker när lokalbehovsplanerna sammanställs till lokalförsörjningsplan och investeringsplan. Det innebär att vissa åtgärdsförslag kan senareläggas, andra kan utgå och åter andra behov kan föreslås mötas med en hyresvärdsupphandling i stället för byggnation i egenregi. Den slutliga planen är därför inte identisk med en summering av de åtgärdsförslag som respektive nämnd beslutat om som sitt planeringsunderlag. Särskilt i de

planer som tas fram under 2026 kommer mer omfattande omprioriteringar att göras, utifrån det uppdrag som fullmäktige beslutade om hösten 2025 i sin årsplan (KS2025/189)

att kommunens investeringar skulle sänkas med 30% under 2026 jämfört med föregående års investeringsplan.


2. Inledning

2.1 Syfte och lokalprocess

Principerna för kommunens lokalstrategiska arbete beskrivs i "Lokalförsörjningsstrategi" (KS2024/780) som beslutades av kommunfullmäktige 2025-12-09, §18. Strategin syftar till att tydliggöra hur det lokalstrategiska arbetet eftersträvar hög lokaleffektivitet och god ekonomisk hushållning med de gemensamma resurserna. Eftersom lokalkostnader är en stor andel av verksamheternas ekonomi och kommunens totala investeringsbehov är omfattande, är det viktigt att hålla nere kostnaderna så långt det är möjligt och endast inkludera nödvändiga lokalåtgärder.

För att uppnå ändamålsenlig lokalplanering till lägst kostnad över tid, där kostnad och nytta är i balans, tar nämnderna årligen fram lokalbehovsplaner (LBP). Dessa planer utgör grunden till kommunens lokalförsörjningsplan (LFP). Lokalförsörjningsplanen är i sin tur ett planeringsunderlag och stöd till prioritering i kommunens budgetprocess och investeringsplan (IP). Figur 2 visar processen med framtagande av lokalbehovsplaner och lokalförsörjningsplan.


Figur 2: Lokalförsörjningsprocessen

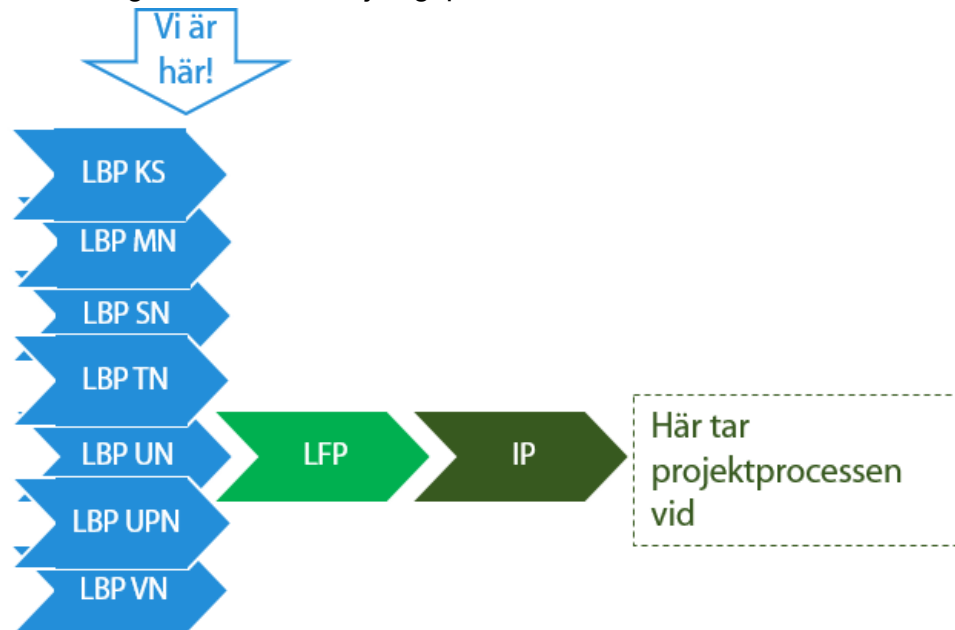

Utbildningsnämndens tar fram en lokalbehovsplan för sina respektive verksamhetsområden: förskole-, grundskole-, gymnasie- samt vuxenutbildning. Dokumentet syftar till att tydliggöra hur utbildningsförvaltningens verksamhetslokaler behöver vidareutvecklas för att möta det förändrade behovet samt säkerställa platser för de barn, elever och studenter som använder förvaltningens lokaler.

Grunden för lokalbehovsplanen är kommunens utveckling baserat på bostadsplaner och befolkningsprognos, liksom befintligt lokalbestånds skick och funktionalitet, samt de förändringar i omvärlden som ger nya krav på verksamheterna, förnyade arbetssätt och ansvarsområden, med mera. Figur 3 visar komplexiteten i de olika påverkande faktorer som ligger bakom behovsanalysen.

Figur 3: Behovsanalysens beståndsdelar

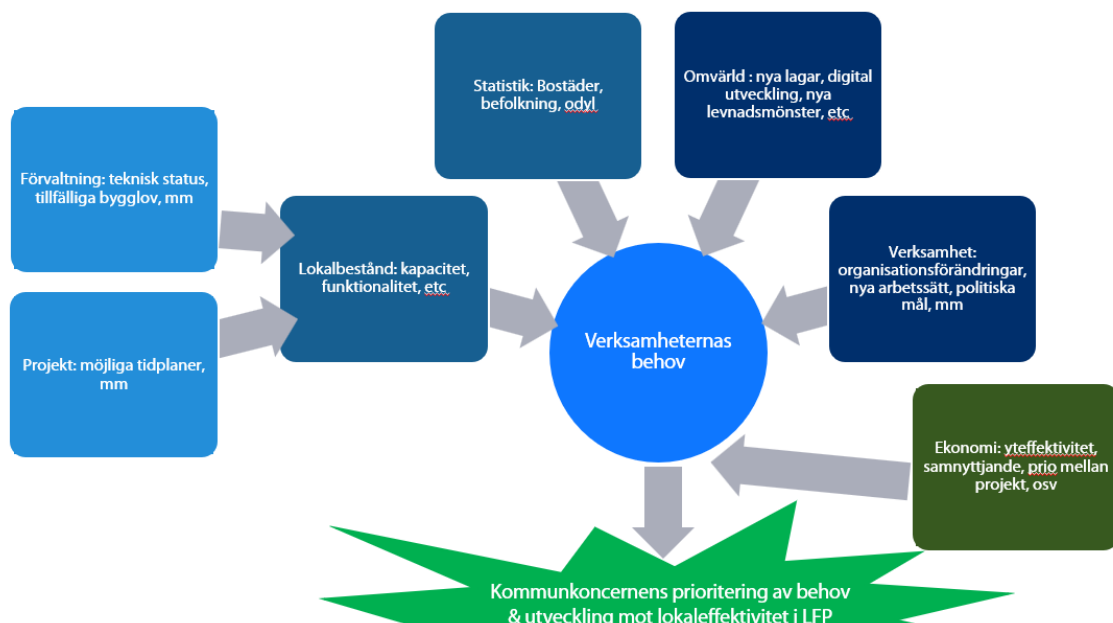


De åtgärder som förslås avser lokalåtgärder som föreslås ingå i kommunens budget och investeringsplan. Lokalbehovsplanen redovisar inte åtgärdsförslag som är verksamhetsåtgärder (ändrade arbetssätt eller förvaltningens årliga hyresgäst Anpassningsmedel).

2.1.1 Lokalplanering

Det löpande arbetet under året sker enligt en strukturerad och dokumenterad process som medger god samordning mellan berörda parter och tar hänsyn till fysisk planering, verksamhetsplanering och ekonomisk planering. För enskilda projekt behöver det finnas en tydlig vision, effektmål (vad vill verksamheten uppnå på sikt), flöden, samband och ekonomiska kalkyler.

Utöver enskilda investeringsprojekt genomförs även lokalanpassningar av olika slag löpande under årets gång. Det här kan exempelvis vara upprustning av utemiljö, tillgänglighetsanpassningar, omorganisationer i verksamhet som kräver förändrade lokaler, eller utökningar av säkerhet. För detta finns årligen en investeringssumma som fördelas i samråd med verksamhet, lokalsamordnare, och förvaltare på mindre eller mellanstora åtgärder. Under året inkommer önskemål och behov som sedan bedöms utifrån kriterierna att nå goda ändamålsenliga lokaler med ekonomi och nytta i balans. **Figur x** åskådliggör processen för arbetet med årliga verksamhetsanpassningar.

Processkarta för verksamhetens anpassningsbeställning.

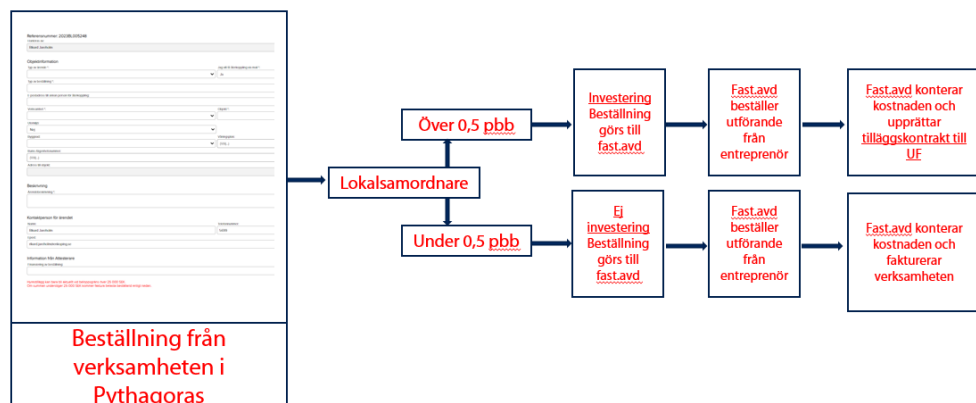

Det befintliga lokalbeståndet ses kontinuerligt över och anpassas för att kunna öka kapaciteten vid behov. Detta betyder att lokalplaneringen behöver balanseras mellan ett kort perspektiv med temporära lösningar och ett längre med permanenta lösningar.

2.2 Förutsättningar – uppdrag och styrning

Alla utbildningsförvaltningens lokaler ska vara ändamålsenliga, säkra, ha låg miljöpåverkan, kunna utnyttjas effektivt, och produceras till lägsta möjliga kostnad över tid.

Lokalerna som utbildningsförvaltningen disponerar ska vara av god kvalitet både inomhus och utomhus. De ska vara flexibla och utformas så att de upplevs trygga och de ska vara utformade på ett sådant sätt att de skapar bästa förutsättningar för att motverka kränkningar och mobbning. Lokalerna ska vara en mötesplats för gemenskap, vara redo för kommande befolkningsökning och möjliggöra tillgänglighet för alla. Lär miljön ska även ha en bred repertoar av metoder och lösningar för att nå kunskap och utveckla lärande och kreativitet.

2.2.1 Kommunens övergripande mål

Enköpings vision 2030

Visionen för Enköpings kommun är att skapa en tillvaro där kommunens invånare upplever att "Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag". Visionens tre inriktningar har bärighet på lokalbehovet på olika sätt:

- *Självklar livskvalitet:* Bästa möjliga livskvalitet eftersträvas oavsett ålder, samt delaktighet och inflytande. Livskvalitet inkluderar utbildningslokaler från förskola till vuxenutbildning som möjliggör och bidrar till livslångt lärande.
- *Attraktivast i regionen:* Innebär bland annat att erbjuda ändamålsenliga utbildningslokaler.

- *En hållbar omvärldsaktör:* Kommunen hushållar med mark- och materialresurser genom att planera så yteffektiva lokaler som möjligt. Exempelvis eftersträvas samnyttjande av ytor så långt det är möjligt. Klimatpåverkan minimeras genom miljövänliga materialval och energisnåla byggnader, liksom geografisk placering av tomter för kommunal service i lägen som uppmuntrar till användning av kollektivtrafik.

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027

På en övergripande nivå är det kommunfullmäktiges långsiktiga plan som styr och prioriterar utvecklingen. Den övergripande målbilden är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i, vilket görs genom mål om *samhörighet*, *självständighet* och *stolthet*. Planens fyra fokusområden för att möta framtiden har bärighet på lokalbehovet:

- *Ökat fokus på barn och unga:* Goda och ändamålsenliga lokaler till förskola, skola och gymnasium bidrar till att skapa trygg uppväxt oavsett familjens socioekonomiska status.
- *Kompetensförsörjning:* Lokaler för Komvux, svenska för invandrare (SFI) och yrkesutbildningar bidrar till kompetensförsörjning inom såväl kommun som privat sektor. För att vara en attraktiv arbetsgivare, behöver kommunens lokaler erbjuda en god arbetsmiljö.
- *Näringsliv:* Utbildningsförvaltningens lokaler tillsammans med utbildningslokaler för de fristående förskolor och friskolor som finns i kommunen skapar tillsammans kapaciteten. Även om kommunens lokalförsörjning fokuserar på lokaler för verksamheter i egen regi, behöver den ta hänsyn till de privata verksamheterna och vid behov se över mark för skollokaler även på privatägd mark.
- *Brott mot välfärden:* Lokaler planeras generellt för att vara säkra och trygga och därmed minska möjligheter till mindre brott såsom skadegörelse.

2.2.2 Utbildningsnämnden

I utbildningsnämndens utvecklingsmål 2025–2026 specificerar de fyra utvecklingsområden:

- Ökad framtidstro hos barn och ungdomar.
- Öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan
- Öka andelen elever som fullföljer sin utbildning i gymnasieskolan

- Öka andelen språkinsatser till utrikesfödda

För att nå dem behövs ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för en trygg miljö med god studiero.

2.2.3 Lagar

Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Den definierar vilka rättigheter som gäller för barn i hela världen. Fyra huvudprinciper gäller:

1. Alla barn och ungdomar ska behandlas lika (§2)
2. Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem (§3)
3. Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas (§6)
4. Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och unga ska ha möjligheter att påverka (§12)

Därutöver preciseras bland annat barns rätt till utbildning enligt §28, som säger att grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Detta innebär att barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i byggandet och ges möjlighet till inflytande i planeringen av de byggnader och den utemiljö som de vistas i en stor del av sin vakna tid. Därför görs barn delaktiga i lokalplaneringen under program- och projekteringsskedet av byggprocessen.

Skollagen

Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Hemkommunen är skyldig att tillhandahålla en plats i skolan för alla barn i kommunen som har rätt till utbildning och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt.

2.3 Befolkningsprognos och historiskt utfall

Befolkningsprognosen utgår från antaganden om antal födda, antal döda samt antal in- och utflyttare till kommunen. År 2024 hade Enköpings kommun 48 591 invånare. Enligt kommunprognos 2025 kommer Enköpings kommun ha cirka 56 260 tusen invånare år 2035, och cirka 60 000 år 2040.

För att kunna planera lokalbehovet arbetar utbildningsförvaltningen utifrån befolkningsprognosen och kommunprognosen som presenteras i oktober/november varje år. Befolkningsprognos 2025 levererades för de närmsta 10 åren (2026–2035) och delas även upp i delområdesprognoser utifrån placeringsområden. Kommunprognosen levererades mellan åren 2024–2040 där befolkningsökningen efter befolkningsprognosens slut (2036) beräknas utifrån ett schablonantagande fördelat jämt på varje år. Observera att ju längre fram i tiden vi kommer desto mer osäker blir prognosen.


2.3.1 Kommunprognosen

Tabellen nedan visar på antal personer, utifrån ålder för förskola till gymnasiet, som enligt kommunprognosen beräknas att finnas i Enköpings kommun, samt vilken förändring som sker. Då kommunprognosen avrundar siffror och är mer generell så kommer nedan siffror ej stämma överens exakt med de siffror som redovisas i delområdesprognoserna.

Ålder	2024	2028	2035	Förändring 2024–2035 (%)	2040	Förändring 2035–2040 (%)
0	486	483	621	135 (28%)	664	43 (7 %)
1–5*	2789	2608	3172	383 (14%)	3464	292 (9 %)
6–12	4390	4397	4339	-51 (-1 %)	4811	472(11 %)
13–15	1793	1881	1979	186 (10%)	2019	40 (2%)

16–18	1772	1869	210 2	330 (19 %)	1977	-125 (-6%)
--------------	------	------	----------	------------	------	------------

*Notera att antalet gäller antal barn i förskoleåldern och räknar inte in att ett visst antal inte går i förskolan. Detta redovisas i barnprognosen, kapitel 3.1.2.

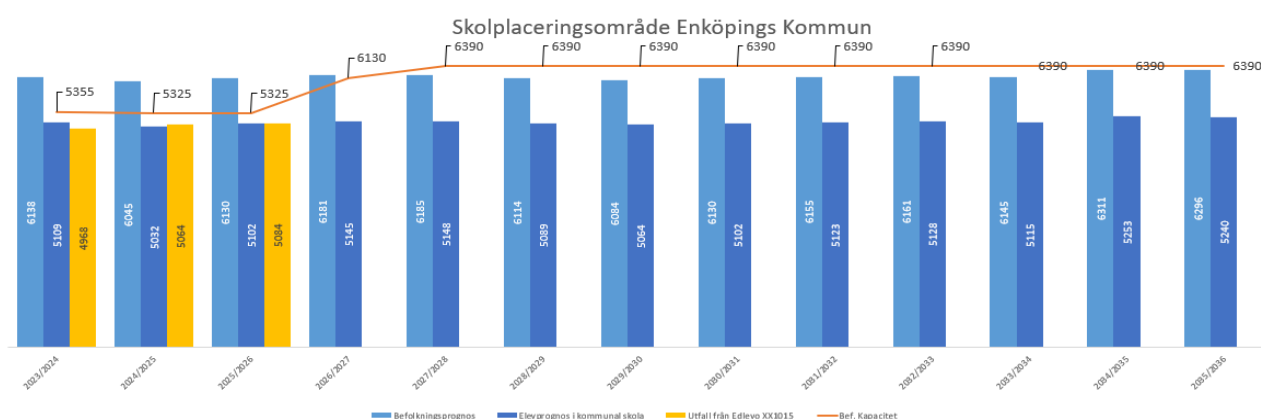

Exempel - Prognos över elevprognos för kommunal grundskola i hela Enköpings kommun.

2.3.2 Barnprognos och elevprognos

Befolkningsprognosen i kombination med analys av retroaktiv prognos och faktiskt antal inskrivna bildar prognosen av hur många barn och elever som kommer att behöva platser.

Ljusblå: Alla unga från 6–15 år som beräknas bo i området enligt befolknings- och bostadsutvecklingsprognosen.

Gul: Antal inskrivna på grundskolor (enbart kommunala) den 15e maj för respektive år.

Mörkblå: Beräknad prognos utifrån befolkningsprognosen och det historiska utfallet (antal inskrivna).

Orange linje: Befintlig och kommande kapacitet.

2.4 Översiktsplan

Det finns flera olika faktorer som måste tas hänsyn till i planeringen av framtida lokalbehov. Förutom att noggrant följa befolkningsutvecklingen i olika delar av kommunen så behöver lokalplaneringen ta hänsyn till kommunens översiktsplanering. Beroende på hur bostadsområden byggs och hur fristående aktörer etablerar eller avvecklar sig förändras kommunens behov.

Detaljplanearbete för etablering av bostäder pågår i alla placeringsområden. Nedan är en lista över de bostäder som var beräknade i befolkningsprognosen (2023–2033). I år har vi lagt till en kolumn som visar bostäder i årets prognos. Utöver dessa finns fler bostäder i bostadsportföljen, men dessa är ej medräknade då de har en osäkerhet om de kommer att byggas.

Placeringsområde	Antal bostäder 2023–2033	Antal bostäder 2025–2035
Bergvreten	637	654
Enöglå	818	673
Korsängen	886	903
Munksundet	21	74
Romberga	462	587
Skolsta	174	153
Hummelsta	39	101
Lillkyrka	31	53
Grillby	65	135
Fjärdhundra	65	76
Örsundsbro	168	171

I den totala kommunprognosen från år 2036 och framåt beräknas 350 bostäder av den totala bostadsportföljen byggas varje år. Dessa är dock schabloner, ej uppdelade per områden eller specificerade per bostadstyp.

2.5 Energimål

EU:s klimatpolitik påverkar arbetet med energieffektiviseringar via Energy Efficiency Directive (EED) och Energy Performance Building Directive (EPBD). Direktivet sätter krav på energieffektivisering inom offentlig sektor på både nya och befintliga byggnader, samt montering av solceller. För att arbeta med detta jobbar samhällsbyggnadsförvaltningen med ett projekt kallat EnOff. Inom EnOff har ett antal objekt valts ut där energikartläggningar och eventuella åtgärder kommer att genomföras. Även drifttider ses över så att ventilationen inte står på när byggnaden står tom.


För utbildningsförvaltningens lokaler ingår energikartläggningar och eventuella åtgärder för bland annat Rombergskolan, Fjärdhundraskolan, Korsängsskolan, Grillbyskolan, Lillkyrkaskolan, Bergvretensskolan, Hummelstaskolan Skolstaskolan, Gröngarns förskola, Gånsta förskola, S:t Illiansskolan, Salnecke förskola.

3. Förskola



Grillby förskola. Typförskola byggd 2021.

3.1 Nuläge

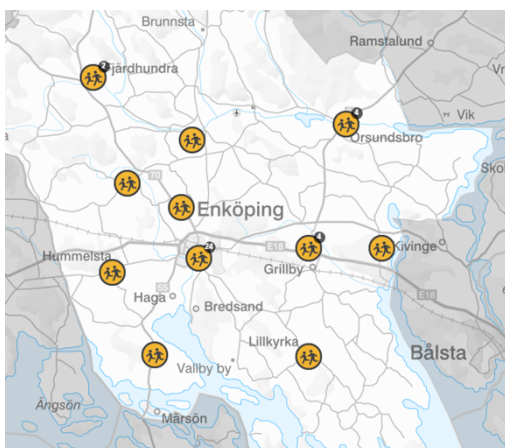

Bilden visar lokalisering av privata och kommunala förskolor i kommunen.

Enköpings kommun har 19 förskolor som bedrivs i både inhyrda och kommunalt ägda lokaler. Det finns även en förskola med kväll-, natt-,

och helgverksamhet, samt en öppen förskola, som också bedriver uppsökande verksamhet, i kommunal regi. I och med att Enköpings kommun är ett finskt förvaltningsområde finns det även en finstalande grupp. Utöver det finns det 22 fristående förskolor i kommunen. Sett till antal barn är förhållandet att ca 63% av de inskrivna barnen går i kommunala förskolor och ca 37% på fristående förskolor.

Byggnaderna varierar i skick och ålder där de äldsta är byggda på 1980-talet och de två senaste färdigställs första halvåret 2026. De senaste förskolorna är byggda enligt en framtagna typförskola för att effektivisera projekteringsprocessen och utveckla verksamheten.

En preliminär beräkning visade på nio förskolor som behövde ersättas eller totalrenoveras inom tio år. För dessa föreslogs det att fyra stycken ska ersättas med en nybyggnation, och fem stycken renoveras. Två stycken är nu renoverade och det pågår planering för renovering av de tre återstående förskolorna. De fyra förskolorna som föreslogs att ersättas befinner sig nu i olika stadier av planering.

I tabellen nedan redovisas de pågående projekt som avslutas under 2026.

Förskola	Projekt	Verksamhetsstart	Status
Ripans förskola	Ersättning och kapacitetsökning	2026	Under byggnation
Storskogens förskola	Ersättning och kapacitetsökning	2026	Under byggnation
Gröngarns förskola*	Renovering	2026	Projektering pågår

3.1.1 Kapacitet

Typförskolorna är byggda för att ha en kapacitet på 160 barn. Den kapaciteten är beräknad utifrån att alla grupper kan vara 20 barn, vilket är grupper för äldre barn. Med en jämn fördelning av äldre och yngre barn med mindre barngrupper och en undervisning utifrån dagens pedagogik blir verksamhetskapaciteten närmre 144 barn.


För varje placeringsområdes kapitel nedan redovisas den maximala kapaciteten som är möjlig, exempelvis 160 barn i typförskolorna. I redovisningen av varje placeringsområdets kapacitet inkluderas även de fristående förskolorna för att ge en bättre bild av hela området.

3.1.2 Sök mönster

Dvs var barnen bor och vart man väljer att gå i förskola. I det flesta områden ser vi inga större avvikelser utan det är egentligen i två upptagningsområden där vi ser tydliga avvikelser.

Munksundets förskolor


Där har vi barn som kommer från Hummelsta omland och Haga vilket känns naturligt. Men även från Bredsandsområdet och Bergvreten. Viket skulle kunna bero på att man sen vill gå i Munksundsskolan. Men även att föräldrar åker vidare mot Västerås skulle kunna vara den enkla

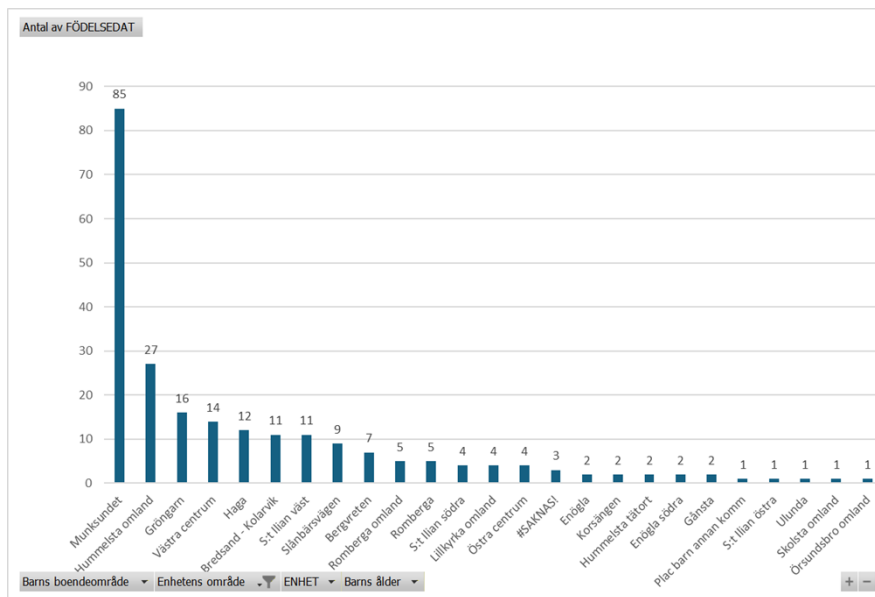

förklaringen.

Korsängens förskolor

Detta är ett idag ett stort område som i framtiden ev behöver delas upp. Det sträcker sig från Bredsand, över Korsängen, Gånsta och Bergvreten. Vilket gör det svårt att fundera på sökmönster. I diagrammet nedan är de områden med ett barn bortsorterat, då detta oftast beror på dubbla boenden. Detta är ett område som är stort, som i framtiden skulle kunna delas upp. Det sträcker sig över Bredsand och Korsängen.

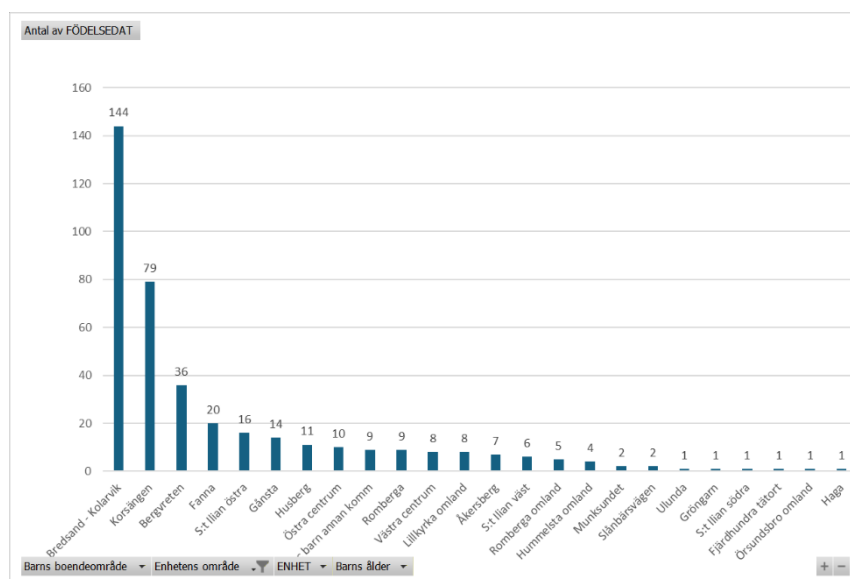


3.1.3 Befolkningsutveckling


I barnprognosen för de kommande tio åren från 2027–2036 ser vi att den tidigare prognosen som visade på att barnantalet skulle sjunka något fram till 2029. Den har nu förändrats och vi har en långsamt stigande kurva under hela prognosperioden. Barnprognosen (mörkblå stapel) baseras på befolkningsprognosen (ljusblå stapel) och det historiska utfallet som tar i beaktning både antal inskrivna och procentuell fördelning av antal barn för varje årskull.

Den faktiska tillväxten visar att det generellt sker en större ökning av antal barn i förskolan i centrala Enköping än vad prognosen säger. Detta beror på flödet mellan upptagningsområden och att fler familjer väljer en förskola i tätorten Enköping i stället för i kransorterna där de blivit placerade.

Prognosen för förskolor räknar även med kapaciteten på de fristående förskolorna för att få en mer rättvis bild av nuläget.

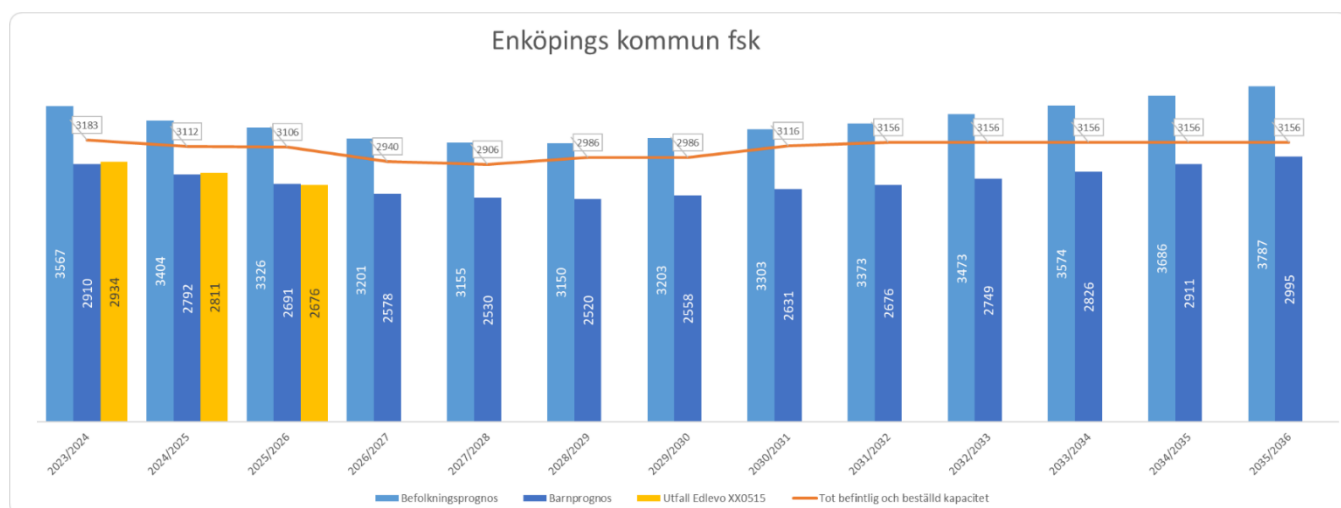

Befolkningsutveckling barn i förskoleåldern totalt i Enköpings kommun för perioden 2027–2036. Obs! Fristående förskolor är inkluderat i grafen.

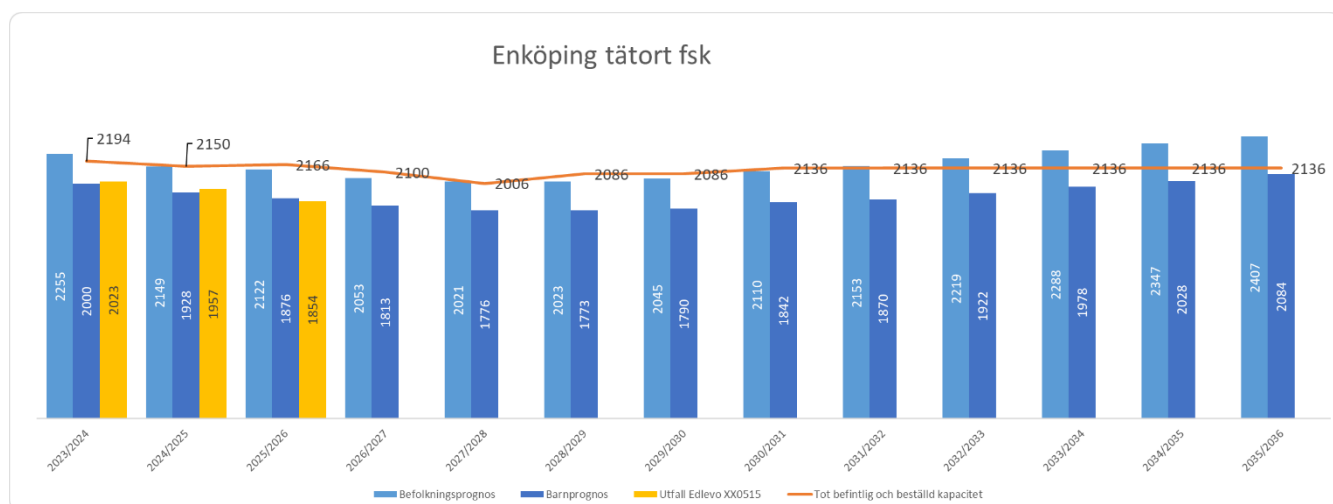

Befolkningsutveckling barn i förskoleåldern i Enköpings tätort för perioden 2027-2036. Obs! Fristående förskolor är inkluderat i grafen.

3.2 Verksamheter och lokaler – per område

Nedan följer en kort beskrivning av hur den förväntade utvecklingen av respektive område ser ut.

3.2.1 Bergvretens placeringsområde


Området har två kommunala och tre fristående förskolor.

Gånsta förskola är byggd 1989 och nyligen renoverad, 2021.

Åkersbergs förskola är relativt nybyggd, 2014, och sitter ihop med Åkersbergs äldreboende. Förskolan och äldreboendet delar på matsal- och kökslokaler.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Åkersberg fsk	K	126	129
Gånsta fsk	K	77	78
Robinson Tellus	P	150	109
Skogsviolens fsk	P	28	32
Lärkans fsk	P	30	30
Summa		406	378

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Bergvretens placeringsområde.

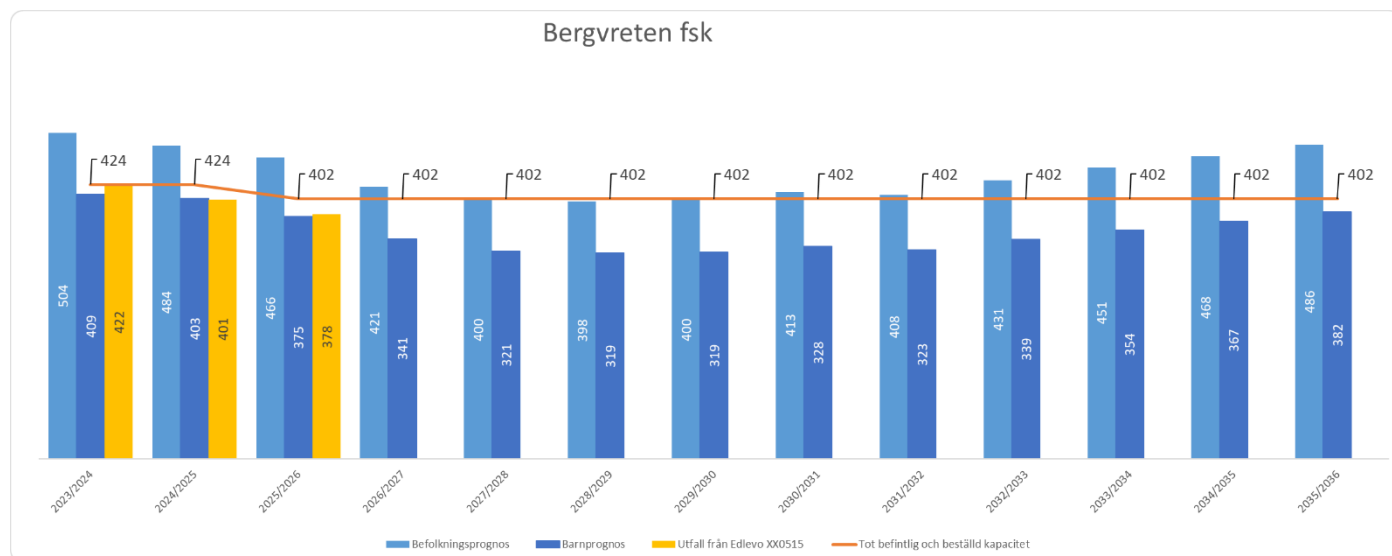

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2036. Notera att under 2023 öppnades den pedagogiska omsorgsverksamheten Solrosen som stängde 2024. Samt att Åkersbergs förskolebuss har tagits ur bruk 2025, detta ses i den redovisade kapaciteten.

Lokalernas skick

Gånsta förskola

Gånsta förskola renoverades under 2021 på grund av mögelskador. I samband med renoveringen byttes olika typer av riskkonstruktioner ut. Det här innebär att förskolan beräknas kunna stå i minst 15år eller mer innan någon större renovering behöver genomföras igen. I samband med renovering genomfördes också mindre ombyggnationer.

Åkersberg förskola

Åkersberg förskola byggdes 2014 och lokalerna är i gott skick. Trots den fina och stora utemiljön finns behov av underhåll och anpassningar då material valda vid nybyggnationen inte har varit beständiga.

Planerade förändringar

Det finns inga planerade förändringar.

3.2.2 Enögla placeringsområde

I området finns idag tre kommunala och tre fristående friskolor.


Enögla förskola bedrivs i paviljonger som uppfördes år 2017. Paviljongerna är inhyrda med temporärt bygglov till 2027, och som längst 2032. På Enögla förskola finns också en finsktalande grupp i och med att kommunen är finskt förvaltningsområde.

I anslutning till Enögla förskola ligger kommunens öppna förskola sen 2019, som även bedriver uppsökande verksamhet. Öppna förskolan ligger i kommunens egenägda paviljong från 1980-talet med permanent bygglov.

Sagogrändens förskola bedrivs i EHB:s lokaler. I dessa lokaler finns även kväll-/natt och helgverksamhet, Nattugglan.

Kraftens förskola ligger i lokaler vid Enöglaskolan, framtida Lillsidanskolan, som just nu är under byggnation. Lokalerna är från 1968. I Kraftens förskolas lokaler har det fram till augusti 2024 även bedrivits Svalans asylförskola.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Enögla fsk	K	120	115
Kraftens fsk	K	110	78
Sagogrändens fsk (Nattugglan)	K	100	103
Fsk Hinden	P	120	103
Utforskarens fsk (Enögla)	P	40	39
Utforskarens fsk (Björkbacken)	P	40	38
Summa		530	476

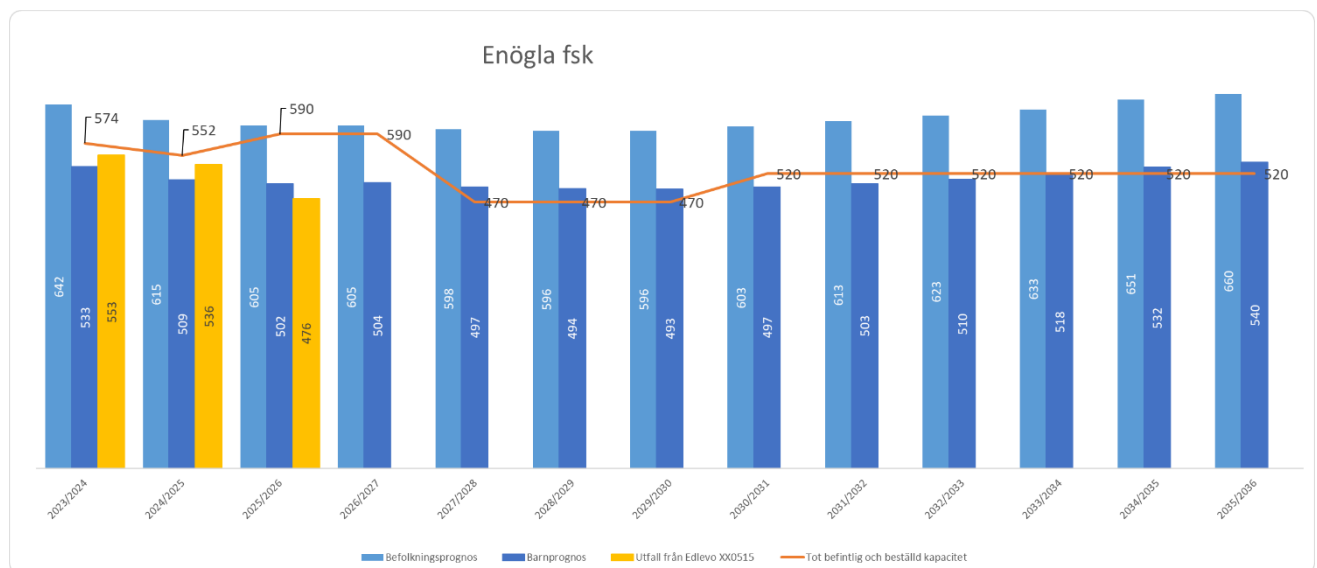

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Enögla's placeringsområde.

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2036. Notera att kapacitetsminskningen som sker 2027 är att bygglov för Enögla förskolas paviljonger löper ut. år 2026 står nybyggnation Ripans förskola klar som ersätter Sagogrändens förskola, samt att Kraftens förskolas förskolebuss har tagits ur bruk 2025 i den redovisade kapaciteten.

Lokalernas skick

Enögla förskola

De inhyrda paviljongerna upplevs trånga och ej effektiva för dagens verksamhet. Lokalerna är i gott skick. Under året har projektet med att ersätta denna förskola med en permanent enhet påbörjats. Denna nybyggnation beräknas idag vara klar till 2030 och samplaneras med ett vård- och omsorgsboende. Modulerna är uppsagda och barnen evakueras till Kraftens fsk under byggnationen.

Öppna förskolan

I de äldre modulerna ligger öppna förskolans och familjecentral. Lokalerna ska under våren inventeras vad gäller ytskick och installationer.

Sagogrändens förskola

Lokalerna är i behov av en stamrenovering, har återkommande arbetsmiljöproblem och lämpar sig ej för verksamheten. Lokalerna är uppsagda.

Ripans förskola

Förskolan är nybyggd och kommer att tas i bruk under våren 2026. Ersätter Sagogrändens förskola med kväll-/natt och helgverksamhet.

Kraftens förskola

Lokalerna är inte byggda för förskoleverksamhet från början vilket innebär att de inte är yteffektiva. Verksamheten har upphört. Enheten kommer att användas som evakueringslokal när Gröngarns förskola ska renoveras. Men även när Enögla fsk moduler utryms, detta fram till att den nya förskolan är färdig.

Planerade förändringar

Temporära:

Enögla förskola paviljonger

Enögla förskola har beviljats ett temporärt bygglov till 2027, modulerna är uppsagda, detta då nybyggnationen ska kunna placeras för att vi ska uppnå önskade utemiljötor på förskolan.

Permanent:

Ripans förskola

Sagogrändens förskola med kväll-/natt och helgverksamhet kommer att flytta till en nybyggd lokal, Ripans förskola.

Enögla förskola

En nybyggnation projekteras nu med ett vård- och omsorgsboende. Ersättningen för Enögla förskola planeras att stå klar 2030 för att synka tidsplanen med vård- och omsorgsboendet samt att bemöta befolkningsprognosen.

3.2.3 Fjärdhundra placeringsområde


Området har en kommunal och två fristående förskolor.

Fjärdhundra förskola är byggd 2012. För att temporärt öka kapaciteten har förskolan kompletterats med en förskolebuss som tas ur bruk sommaren 2025.

Många i det här området väljer att ha sina barn inne i centralorten istället för i Fjärdhundra.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Fjärdhundra fsk	K	72 (exkl. buss)	86
Härnevi fsk	P	30	30
Vitbjörkens fsk	P	31	32
Summa		133	148

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Fjärdhundra placeringsområde.

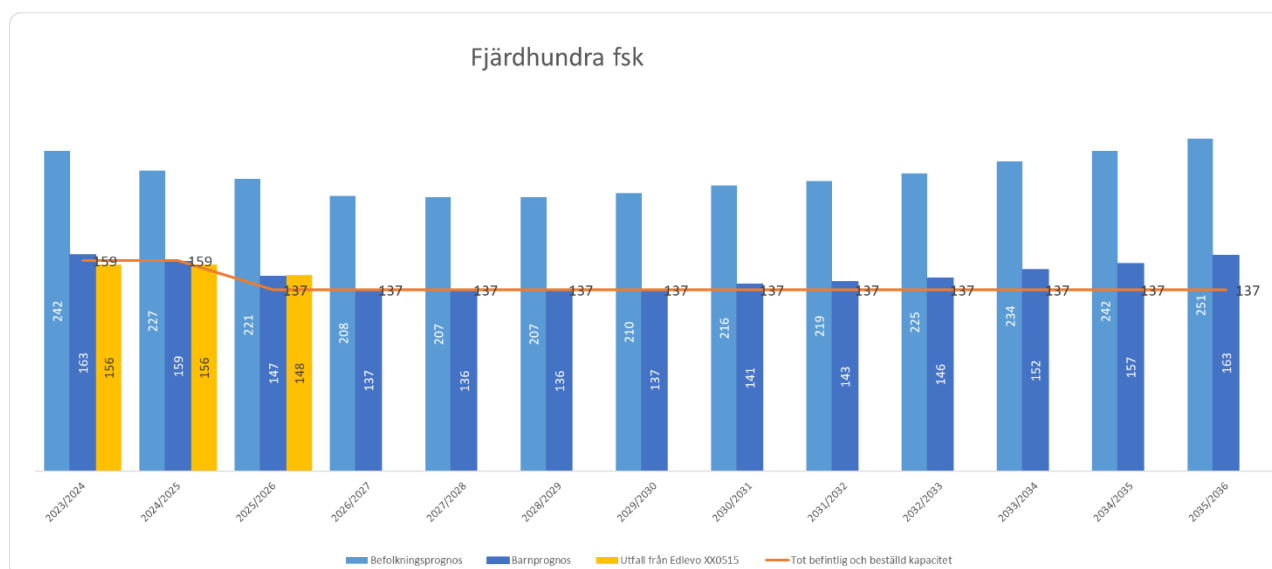

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att Fjärdhundra förskolas förskolebuss har tagits ur bruk 2025 i den redovisade kapaciteten.

Lokalernas skick

Fjärdhundra förskola

Fjärdhundra förskolas lokaler är i gott skick, utemiljön håller på att ses över.

Planerade förändringar

Inga planerade förändringar

3.2.4 Grillby placeringsområde


Området har en kommunal och fristående förskola.

I dagsläget finns en privat aktör i området där detaljplanen ej medger förskoleverksamhet på fastigheten och permanent bygglov saknas.

Hösten 2021 stod den nya förskolan i Grillby klar för inflytt. Den nya förskolan är placerad bredvid skolan för att möjliggöra flexibelt lokalutnyttjande mellan skolan och förskolan om det behövs i framtiden.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Grillby fsk	K	160	109
Solstrålen fsk	P	30	32
Summa		190	141

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Grillby placeringsområde

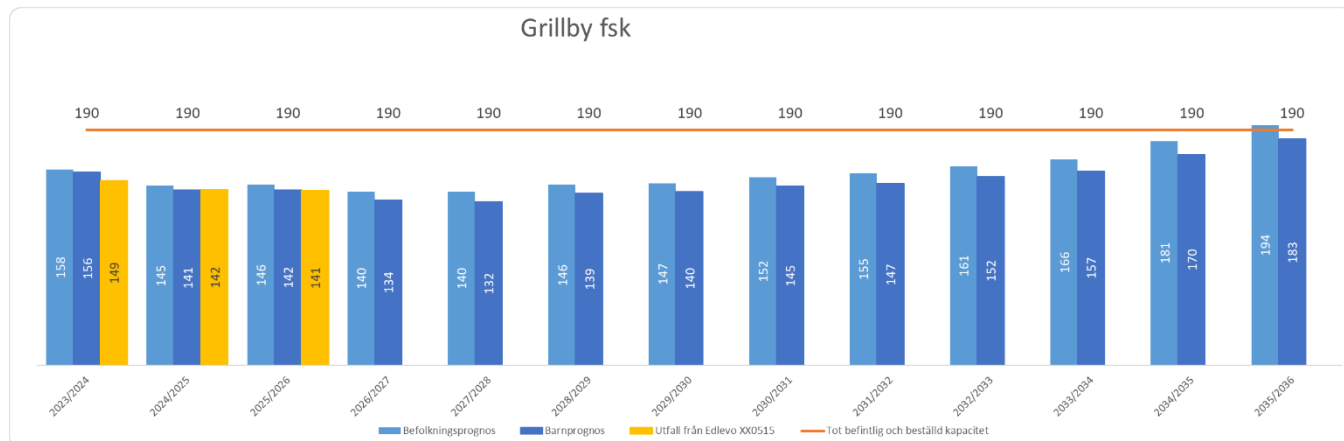

Lokalernas skick

Grillby förskola

Nybyggd förskola, inga anmärkningar.

Utemiljön kommer att förstärkas under året med bland annat grönska och lekutrustning.

Planerade förändringar

Inga planerade förändringar finns i området.


3.2.5 Hummelsta placeringsområde

Området har en kommunal och en fristående förskola.

Hummelsta förskola är den senaste typförskolan och stod klar 2022.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Hummelsta fsk	K	160	112
Uppnäsans fsk	P	22	21
Summa		182	133

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Hummelsta placeringsområde.

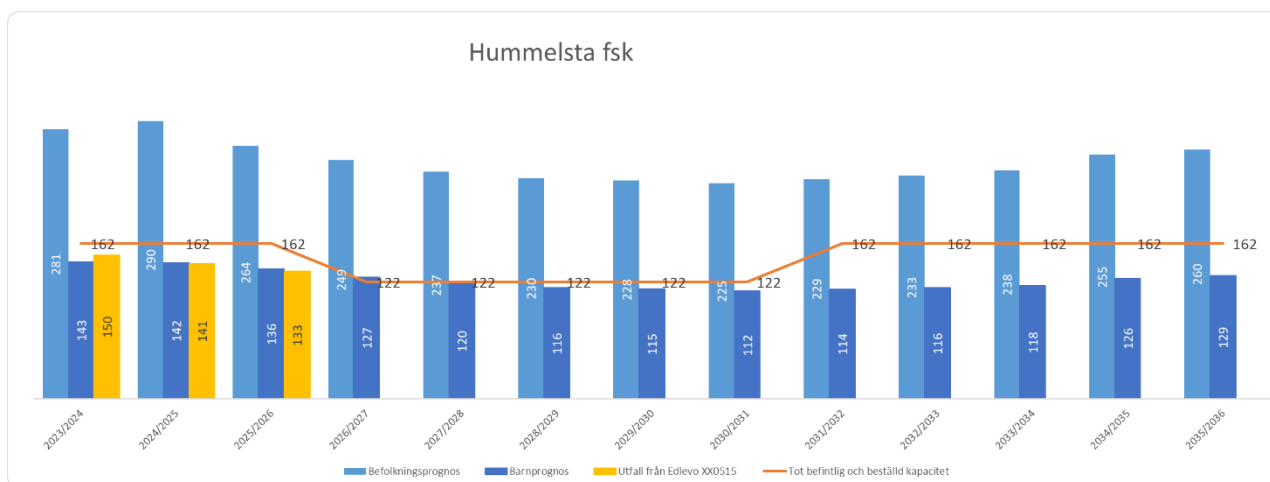

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2036.

Lokalernas skick

Hummelsta förskola

Nybyggd förskola. Byggnaden är i gott skick, men har haft en del tekniska besvär som har åtgärdats det senaste året. Saneringen av utemiljön, vilket upptäcktes efter inflytt, kommer att genomföras under 2026.

Planerade förändringar

Inga planerade förändringar finns i området.

3.2.6 Korsängens placeringsområde

I området finns idag tre kommunala förskolor och tre fristående.

Korsängens förskola är en typförskola och stod klar för inflytt höstterminen 2021. Förskolan placerades på den tomt där den gamla stod för att kunna ha en flexibel verksamhet och lokalutnyttjande tillsammans med skolan.


Fannalunds förskola är byggd 1989.

Storskogens förskola bedrivs sen några år tillbaka i paviljonger med temporärt bygglov till 2026, och som längst till 2032.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Fannalunds fsk	K	77	73
Storskogens fsk	K	120	50
Korsängens fsk	K	160	121
Norlandia fsk	P	87	88
Föräldrakooperativet Blixten	P	35	35
Wåga & wilja fsk	P	100	64
Summa		579	431

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Korsängens placeringsområde.

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera

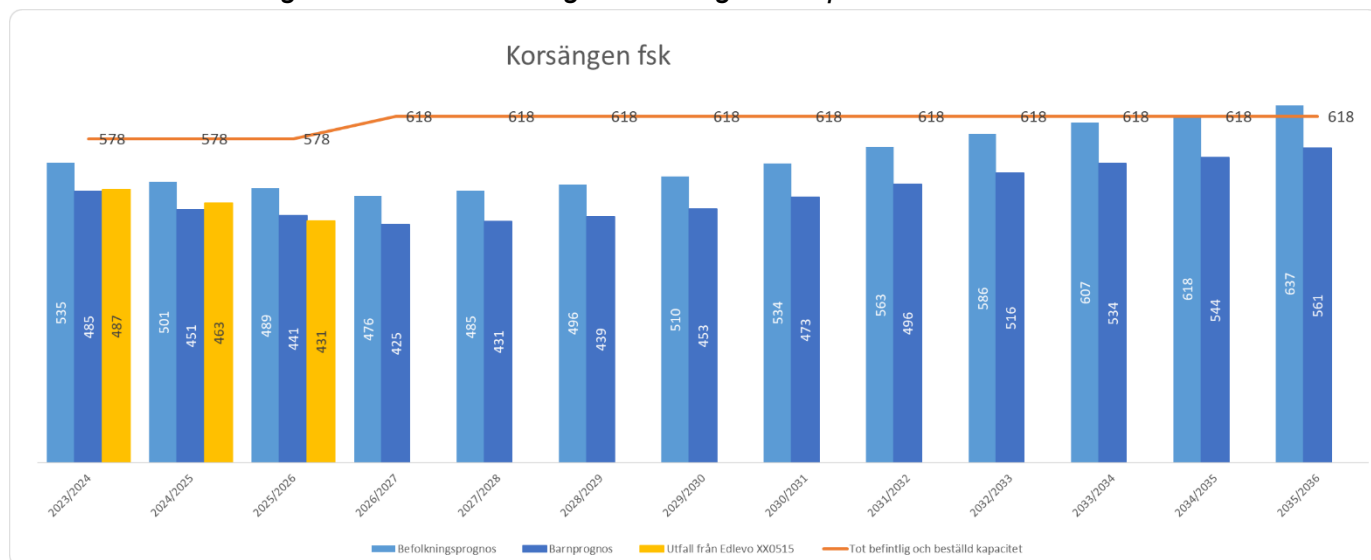

att år 2026 står Storskogens förskola klar och kapaciteten ökas med 40 platser.

Lokalernas skick

Korsängens förskola

Nybyggd förskola, inga anmärkningar.

Fannalunds förskola

Lokalerna renoverades 2025.

Storskogens förskola

Lokalerna är inhyrda, och i gott skick. Dom är nu uppsagda och vi kommer under våren 2026 flytta verksamheten till den nya förskolan.

Planerade förändringar

Temporära:

Storskogens förskola

De inhyra lokalerna är uppsagda.

Permanenta:

Storskogens förskola

Storskogens förskola kommer ersättas av en permanent förskola 2026. Den nybyggda förskolan är placerad ett par hundra meter från den nuvarande förskolan. Utvecklingen av bostadsbyggandet har stannat av i området. Vi kommer att hålla övervakningen i nya förskolan stängd tills vi ser att byggnationen kommer ta fart igen. Men vi ser att det är ca 100 barn utifrån Bredsand – Kolarvik som åker in till Enköping för att gå i förskola där. Kommer det att ändras nu när vi har en ny förskola?


3.2.7 Lillkyrka placeringsområde

Området har en kommunal förskola.

Lillkyrka förskola är byggd i början av 2000-talet med en större renovering 2019. Byggnaden ligger i anslutning till Lillkyrkaskolan.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2025
Lillkyrka fsk	K	72	74
Summa		72	74

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till

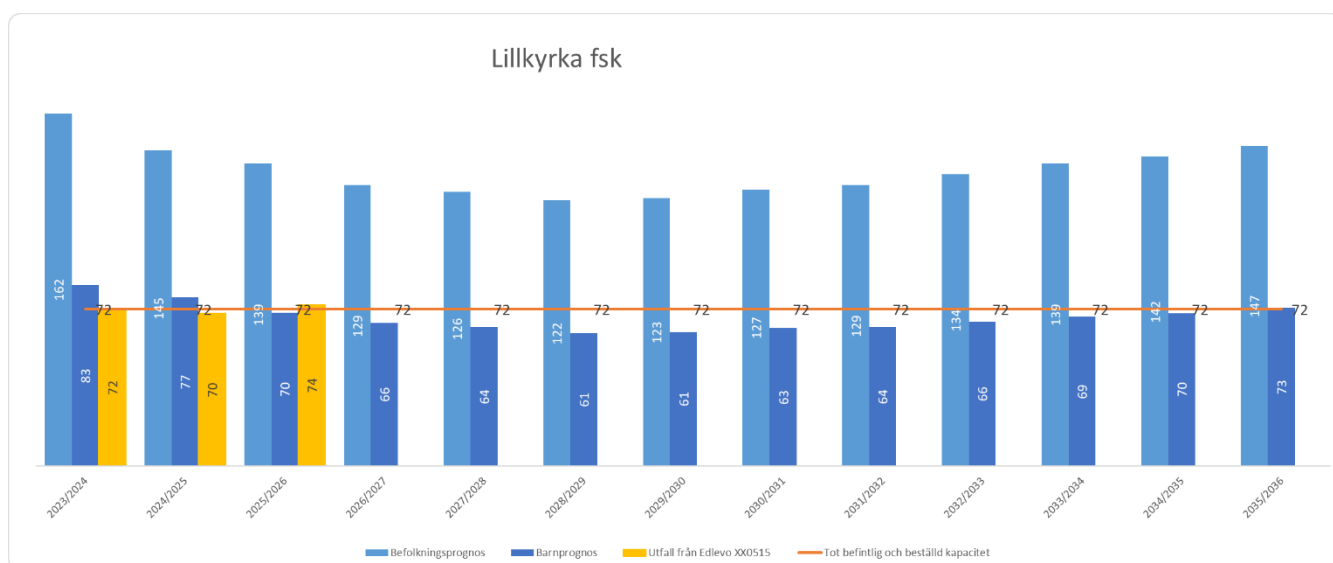

antalet barn i Lillkyrka placeringsområde.

*Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2035.
Upptagningsområdet är stort och i grafen ser vi att en stor del av familjerna i upptagningsområdet placerar sina barn på andra förskolor.*

Lokalernas skick

Lillkyrka förskola
Nyrenoverad förskola sen 2019.

Det finns stora grön-och skogsområden i direkt anslutning till förskolan där det finns möjlighet att starta utegrupper om verksamheten snabbt skulle öka.

Planerade förändringar

Inga planerade förändringar finns i området.

3.2.8 Munksundets placeringsområde

Området har tre kommunala förskolor.

Gröngarns förskolor byggdes på 1980-talet.


Bolmörtens förskola byggdes på 1980-talet, och utökades 2006 med en tillbyggnad innehållande bland annat personalavdelning.

Munkkällans förskola hänger ihop med grundskolan Munkssundsskolan, och är en typförskola byggd 2018.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2024
Munkkällans fsk	K	120	111
Gröngarns fsk	K	106	98
Bolmörtens fsk	K	80	73

Summa	306	282
--------------	------------	------------

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Munksundets placeringsområde.

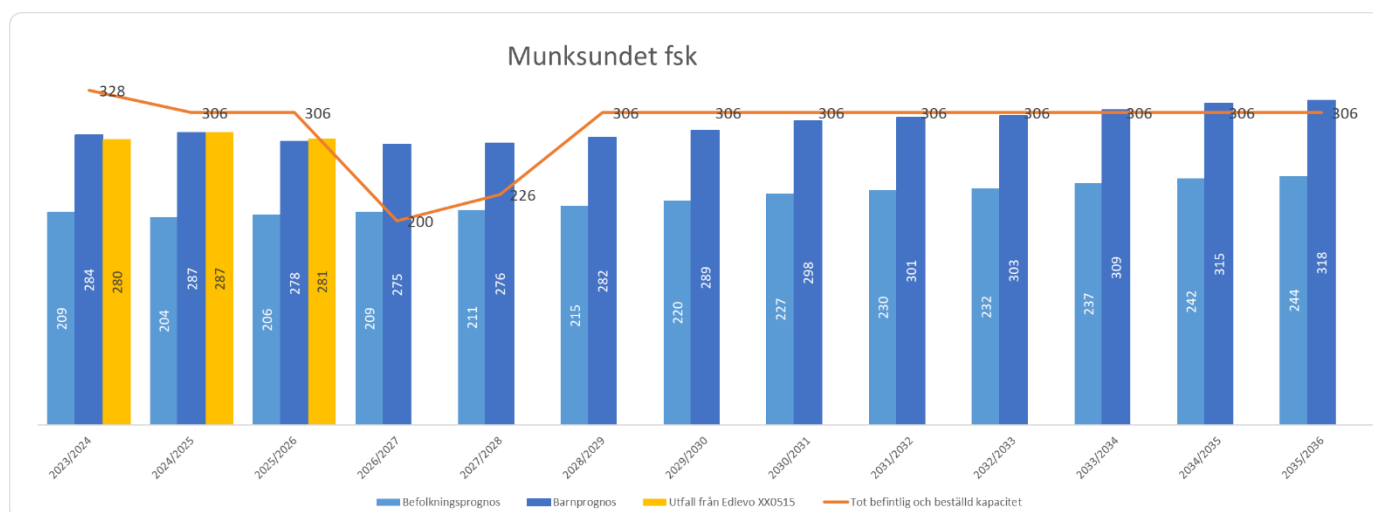

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Jämfört med många andra placeringsområden visar grafen här att många från andra områden väljer att placera sina barn i dessa förskolor. Notera att 2024 togs förskolebussen på Gröngarns förskola ur bruk.

Lokalernas skick

Bolmörtens förskola

Lokalerna är i behov av underhåll och renovering för att bygga bort riskkonstruktioner. Byggnaden har haft direktverkande el, men förseddes 2022–2023 med luft/vatten-värmepumpar.

Gröngarns förskola

Gröngarns förskola är i behov av underhåll och renovering för att bygga bort riskkonstruktioner. En energikartläggning har genomförts för att hitta åtgärder som minskar energianvändningen.

Munkkällans förskola

Nybyggd förskola. Förskolan har haft problem med buller från ventilation och lukt från avlopp som har åtgärdats löpande.

Planerade förändringar

Temporära:

Bolmörtens och Gröngårns förskola kommer att behöva evakueras under sina renoveringar.

Permanent:

Bolmörten och Gröngårns förskola kommer under de kommande åren att renoveras för att byta ut riskkonstruktioner. I samband med detta byggs vissa delar om för att bättre anpassa lokalerna till verksamheten. Utredning av specifikt vad som behöver anpassas genomförs under 2025/2026.

Renoveringarna är planerade att genomföras en förskola per år, 2026–2028.


3.2.9 Romberga placeringsområde

Området har en kommunal och fyra fristående förskolor.

Lärlingen förskola består av en äldre byggnad från 1980-talet och en nyare tillbyggnad från 2017.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2024
Lärlingen fsk	K	106	95
Enköpings Montessori fsk	P	34	34
Sävsta Ekologiska fsk	P	30	32
Sparrsätra fsk	P	20	27
Child Sport Academy	P	100	100
Summa		290	288

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom Romberga placeringsområde.

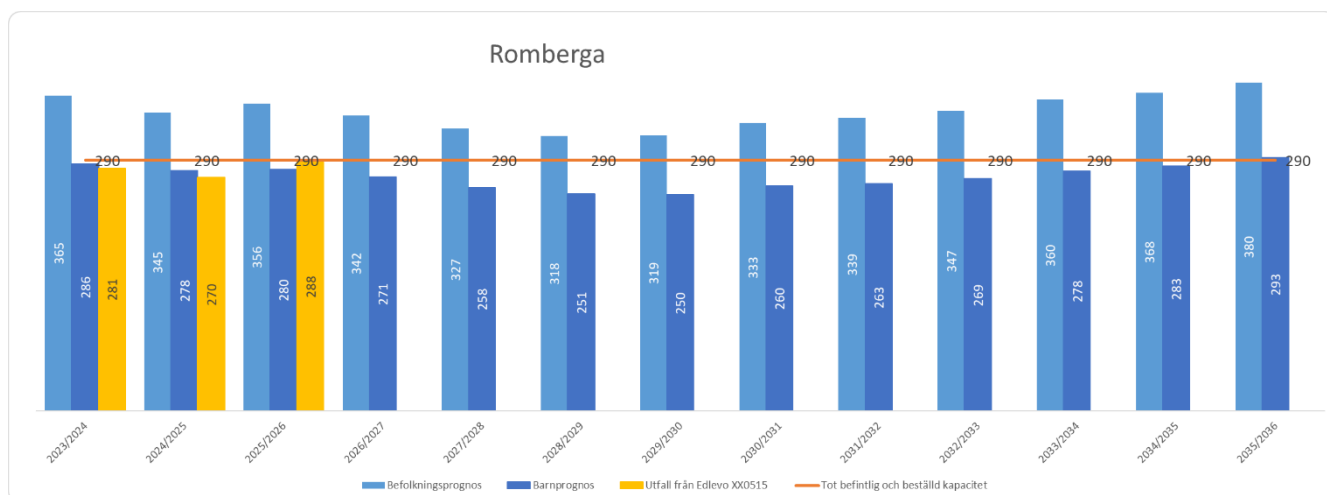

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att den kapacitetsökning som skedde 2022 är när Child Sport Academy öppnade.

Lokalernas skick

Lärlingens förskola

Den äldre delen av Lärlingens förskola renoverades under 2022. I samband med renoveringen byttes olika typer av riskkonstruktioner ut. Det här innebär att den äldre delen av förskolan beräknas kunna stå i 15 år eller mer innan någon större renovering behöver genomföras igen. I samband med renovering genomfördes även mindre ombyggnationer.

Planerade förändringar

Inga planerade förändringar finns i området.


3.2.10 Skolsta placeringsområde

Området har en kommunal och två fristående förskolor.

Skolsta förskola bedriver sin verksamhet i en befintlig byggnad som är ca 15 år gammal samt en kommunalt ägd paviljong från 1980-talet med temporärt bygglov till 2026, men som längst 2031.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2024
Skolsta fsk	K	67	50
Paletten Ekolsund	P	25	19
Paletten Skolsta	P	25	26
Summa		117	95

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i mått på antalet barn inom Skolsta placeringsområde.

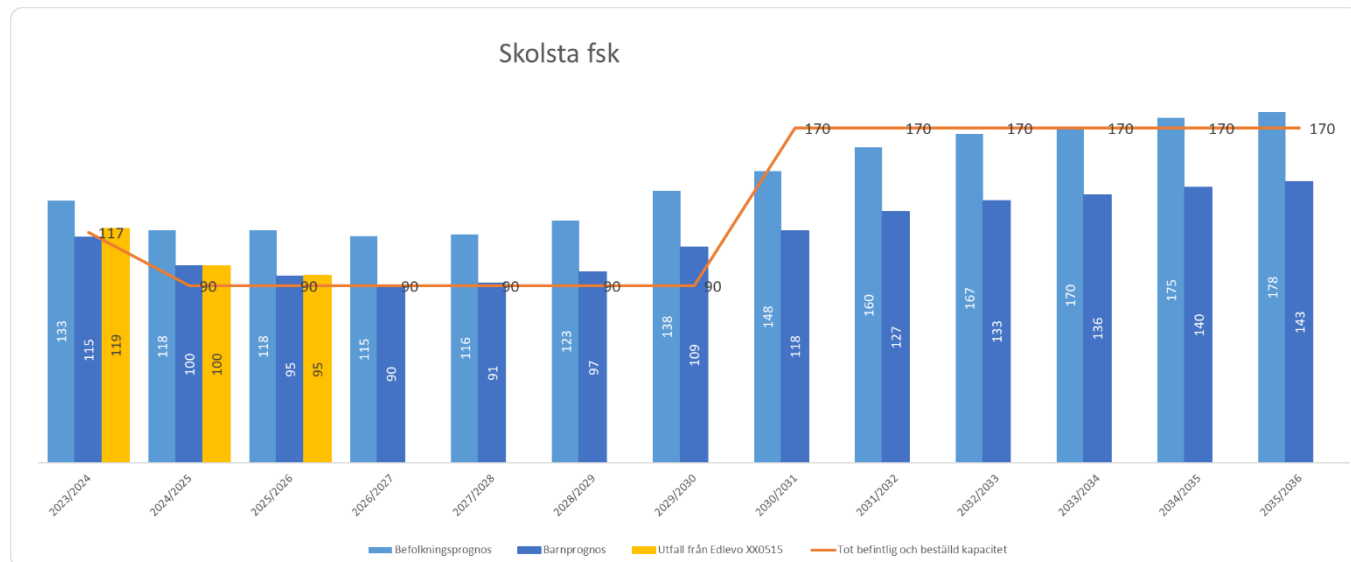

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att i tabellen står nybyggnation Skolsta förskola klar 2028, en förskjutning med ett år jämfört med tidigare plan.

Lokalernas skick

Skolsta förskola och paviljonger

Befintlig byggnad i bra skick, inga anmärkningar.

Planerade förändringar

Temporära:

Skolsta förskola och paviljonger

En del av Skolsta förskola bedrivs idag i en paviljong där bygglov
löper ut 2026, med möjlig förlängning som längst till 2031.

Permanent:

Skolsta förskola nybyggnation

Den paviljong som har temporärt bygglov är nu uppsagd, from oktober
2026

Den nya förskolan placeras i närheten av skolan för att få ett bra
lokalutnyttjande och flexibilitet över tid beroende på hur barngrupperna
skiftar i storlek.

I investeringsplanen för 2025–2034 planeras förskolan vara klar för
inflytt 2027. Under sommaren 2025 efter att anbud antagits beslutades
det om att flytta fram färdigställande till 2030. En ny befolkningsprognos
inväntades för att se om tidigare behov består. Paviljongen rivs när den
nya förskolan är klar.

3.2.11 Örsundsbro placeringsområde


Området har två kommunala och två fristående förskolor.

Örsundsbro förskola är en typförskola och stod klar 2020. Förskolan är
placerad bredvid skolan för att möjliggöra flexibelt lokalutnyttjande
mellan skolan och förskolan om det behövs i framtiden.

Salnecke förskola är byggd i två etapper under 1980-talet.

Förskola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna maj 2024
Örsundsbro fsk	K	160	113
Salnecke fsk	K	60	59
Solrosen fsk	P	35	34
Snäckans montessori fsk	P	34	27
Summa		289	233

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i mått på antalet barn inom Örsundsbro placeringsområde.

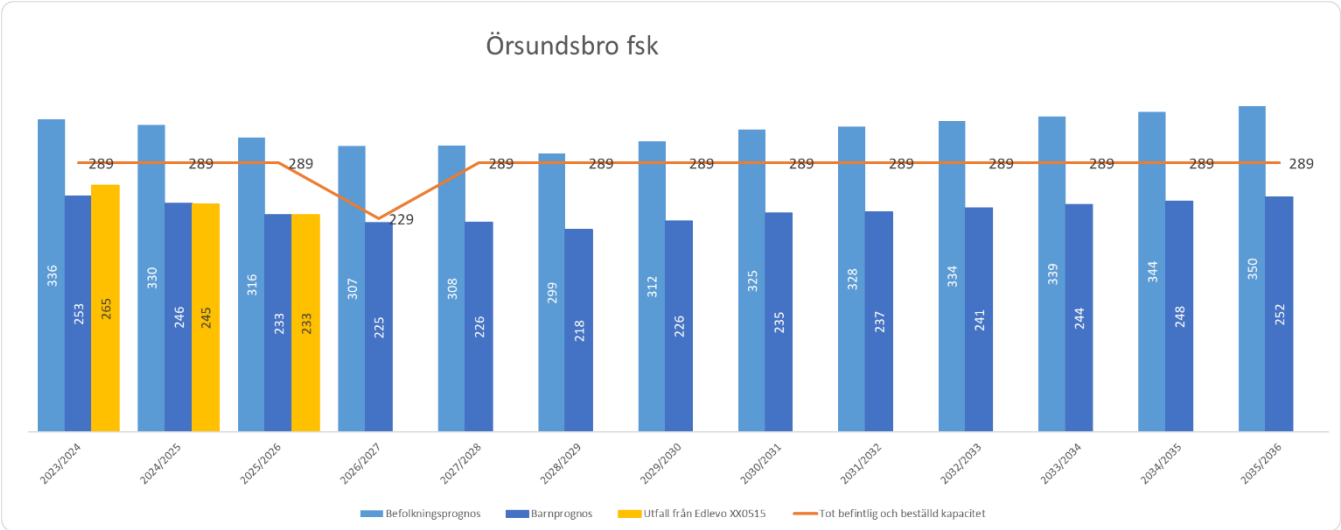

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033.

Lokalernas skick

Örsundsbro förskola

Nybyggd förskola, inga anmärkningar.

Salnecke förskola

Byggnaden är i stort behov av underhåll och behöver renoveringar som bland annat bygger bort riskkonstruktioner, men även åtgärder för energieffektivisering.

Planerade förändringar

Permanent:

Salnecke förskola

En förstudie som skulle utreda en ersättning med nybyggnation, tillbyggnad, eller renovering i kombination med kapacitetshöjning av Salnecke förskola beställdes av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (sen januari 2025 utbildningsnämnden) december 2023. Förstudien genomfördes 2024, och beslutades i utbildningsnämnden april 2025.

För att möta den förändrade barnprognosen rekommenderar förstudien en renovering, ombyggnad och tillbyggnad för teknik och kök. I samband med detta anpassas ventilationen och förskolans kapacitet höjs till 80 platser. Då detta innebär en kortare byggtid än nybyggnation rekommenderas färdigställandedatumet att tidigareläggas till 2028. Detta för att minimera utökade risker för kostsamma evakueringar vid utökade fuktskador samt att minska tiden tills energieffektiviserande åtgärder kan genomföras. Evakuering av verksamheten planeras inom utbildningsförvaltningens befintliga lokaler.

3.3 Framtida utveckling

För att kunna växa i takt med befolkningsökning i centrum så behöver lokalplaneringen jobba med både nyckeltal och begränsningar för att kunna tillgodosebehovet på de tomter som finns tillgängliga. Inte bara utemiljön på förskolegården måste tas i beaktande utan också hur närområdet ser ut. Tillgång till kommunala parker och grönområden i närområdet kommer bli viktigt i nybyggnationer i centrum.

Placeringen av nya förskolor behöver också ta i beaktning var familjerna bor och var de kommer att gå i skola. För att få en bra balans mellan förskolor och skolor behöver alla förskolebarn i ett område få plats på den skola i det upptagningsområde som de tillhör.

De senast byggda förskolorna har främst byggts i kransorterna. De planerade åtgärderna de närmsta tio åren fortsätter att utveckla

kransorterna, med viss nybyggnation och ett antal renoveringar i tätorten. Med de föreslagna åtgärderna i denna plan så kommer behovet av lokaler sett till Enköpings kommun i stort mötas fram till 2035. Alla planerade och pågående projekt utgår ifrån faktorer så som tillfälliga bygglov, lokaler med sämre arbetsmiljö, samt behov av renoveringar.

3.3.1 Planerade och beslutade projekt

I tabellen nedan redovisas samtliga planerade projekt inför Lokalförsörjningsplan 2027 samt Investeringsplan 2027–2036.

Förskola	Projekt	Verksamhetsstart	Status
Bolmörten förskola*	Renovering	2027	Projektering påbörjas 2026
Skolsta förskola	Ersättning och kapacitetsökning	2030	Upphandling hösten 2025, uppskjuten
Salnecke förskola	Tillbyggnad, ombyggnad, renovering, och kapacitetsökning	2027	Projektering påbörjas
Enögla förskola	Ersättning och kapacitetsökning	2030	Projektering 2026

3.3.2 Framtida möjliga projekt

Utöver ovan nämnda projekt pågår ett kontinuerligt pussel som tar hänsyn till nuvarande befolkningsprognos och kapaciteter, men också den minskade tillgången på tillgängliga tomter i centralorten och hur befintliga tomter kan användas så effektivt som möjligt. Projekt i Investeringsplanen 2027-2036 som kan påverkas av detta är bland annat beställningarna av Rosens och Enens förskolor vars förstudier ännu inte är påbörjade.

Projekt efter befolkningsprognosens slut

Förskola	Projekt	Verksamhetsstart	Status
----------	---------	------------------	--------

Rosens förskola	Kapacitetsökning	2037	Tidigt skede, reservation av mark
Enens förskola	Kapacitetsökning	2040	Tidigt skede, reservation av mark
Tallens förskola	Kapacitetsökning	2043	Tidigt skede, reservation av mark

*Årtalen utgår ifrån en ny kapacitetsökning på 160 platser för varje förskola, samt en marginal på 10% mellan kapacitet och behov av förskoleplatser för att möjliggöra flexibla barngrupper. Vid ersättning, en mindre storlek på förskola utifrån tomtstorlekar, eller förändringar i befintligt bestånds kapacitet, så behöver årtalen justeras. Förskolornas namn är arbetsnamn för att underlätta uppföljningen i investeringsplanen och övrig planering. De kan komma att byta namn när en mer exakt beställning genomförs.

Rosens förskola, Enens förskola och Tallens förskola

En beställning på tre förstudier gjordes 2020 av utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN 2019/775). Förstudierna skulle visa på en ersättning av Sagogrändens förskola, en ersättning av Gånsta förskola (Enens förskola i Investeringsplanen), samt en helt ny förskola centralt placerad (Rosens förskola i Investeringsplanen) fram till 2025.

Områden med större bostadsexpansion enligt bostadsportföljen, som inte inkluderas i befolkningsprognosen, är exempelvis Bergvreten, Korsängen, Enögla, Romberga (Myran), och Hummelsta (Vappa). Dessa områden kan vara aktuella lokaliseringar för dessa förskolor. Exakt placering kommer att ses över och specificeras i en ny förstudiebeställning.

4. Grundskola



Visualisering nya Lillsidanskolan.

4.1 Nuläge

Merparten av grundskolorna bedrivs idag i fastigheter byggda mellan 1960- och 80-talet. Renoveringar utförs kontinuerligt och även energibesparande åtgärder ses över.

Grundskolorna är i behov av fler platser för att tillgodose kommande behov samt uppfylla kravet på fritt skolval. Pågående nybyggnationer för att ersätta befintliga grundskolor är Lillsidanskolan (ersätter Enöglaskolan) som planeras tas i bruk 2026, samt Örsundsbroskolan (ersätter gamla Örsundsbroskolan) som planeras tas i bruk 2027. Förutom ovan nämnda nybyggnationerna finns det i investeringsplanen 2026–2035 kapacitetshöjande åtgärder planerat för Korsängsskolan (Nyborg C hus), Bergvretensskolan och Hummelstaskolan. Förstudie för Korsängsskolan (Nyborg C hus) och Bergvretensskolan är godkända och är under projektering. Korsängsskolan (Nyborg C) kommer att färdigställas 2026 och Bergvreten matsal planeras att färdigställas 2027 och nybyggnation/kapacitetsökning planeras att färdigställas 2029.

Förstudie för Hummelstaskolan planeras att beställas våren 2028 om beställningen bedöms behövas.

Det behov vi tidigare sett av att kapacitetsöka på St Ilian och Rombergaskolan har nu minskat.

I investeringsplanen 2026–2035 finns projektet att bygga en ny grundskola i tätort den. Behovet av en ny grundskola finns redan idag, men med kapacitetsökningar av Bergvretensskolan och Korsängsskolan kan projektet Ny grundskola skjutas på framtiden utifrån nuvarande elevprognos.

4.1.1 Kapacitet

Nedan tabeller visar på antal inskrivna i kommunala och fristående grundskolor de senaste åren, samt befintliga kapaciteter på skolorna. Som kommunal huvudman behöver förvaltningen alltid ha i åtanke att om en fristående enhet avvecklas så måste dessa elever beredas plats i den skola som eleven har som närområdesskola.

	Antal elever 2022 utfall	Antal elever 2023 utfall	Antal elever 2024 utfall	Antal elever 2025 Utfall
Kommunal	4874	4968	5064	5192
Fristående	1131	1110	1076	1002
Totalt	6005	6078	6140	6194

Antal elever i samtliga kommunala och fristående grundskolor, utfall 2022, oktober 2023, och oktober 2024, oktober 2025


Skola	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna oktober 2024
Bergvreten (F-9)	K	775	864
Bergvreten anpassad grundskola	K	55	43
Enögla (F-9)	K	550	553
Enögla anpassad grundskola	K	Inkluderas i Enögla F-9	39
Fjärdhundra (F-9)	K	500	361
Grillby (F-6)	K	250	174
Hummelsta (F-6)	K	280	257
Korsängen (F-9)	K	800	833
Lillkyrka (F-6)	K	170	142
Munksundsskolan (F-6)	K	420	376
Romberga (F-3)	K	280	231
Skolsta (F-6)	K	260	212
S:t Ilan (7–9)	K	540	480
Örsundsbro (F-9)	K	500	601
Kunskapsskolan (4–9)	P	630	571
Robinson Fanna (F-5)	P	72	80
Robinson Husberg (F-5)	P	72	88
Robinson Svedia (F-5)	P	72	78
Robinson Vårfru (6–9)	P	164	188
Summa		6390	6089 (+82 anpassad grundskola)

Kapacitet och nyckeltal för samtliga grundskolor i kommunen ht 2024.

4.1.2 Sökmönster


Valet att röra sig mellan skolor är fritt men under senare år så har det varit svårt att uppfylla det då många skolor varit fulla. I kransort ser man att det inte är så många som söker sig dit som inte bor i upptagningsområdet. Däremot i tätort ser man att en handfull elever rör sig mellan skolorna och att skolorna tar emot elever från andra delar av tätort än sitt eget upptagningsområde. De tar även emot några få från kransorterna.

Det man dock kan se är att många skolor i tätort främst tar emot elever från Enöglområdet. En trend som förhoppningsvis vänder när Lillsidanskolan står klar.

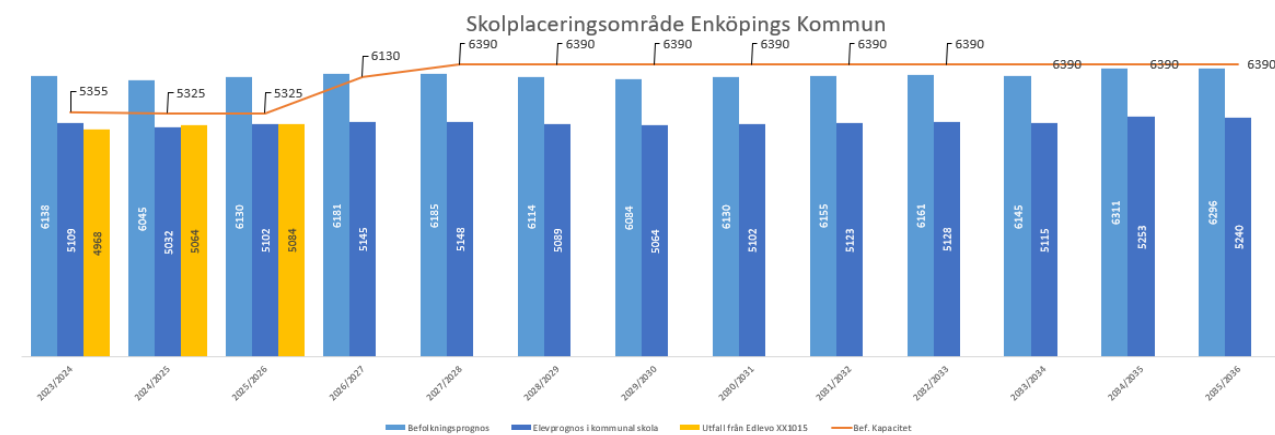


4.1.3 Befolkningsutveckling för elever 6–15 år

Figuren ovan visar elevprognos för elever i åldrar 6–15 år, för perioden 2023–2035. Kapacitetsökning på Bergvretenskolan med 235 platser och en kapacitetsökning på Korsängsskolan med 200 platser finns med i grafen. Den gula och mörkblå stapeln inkluderar inte anpassade grundskolan. Obs! Friskolor är ej inkluderat i grafen.

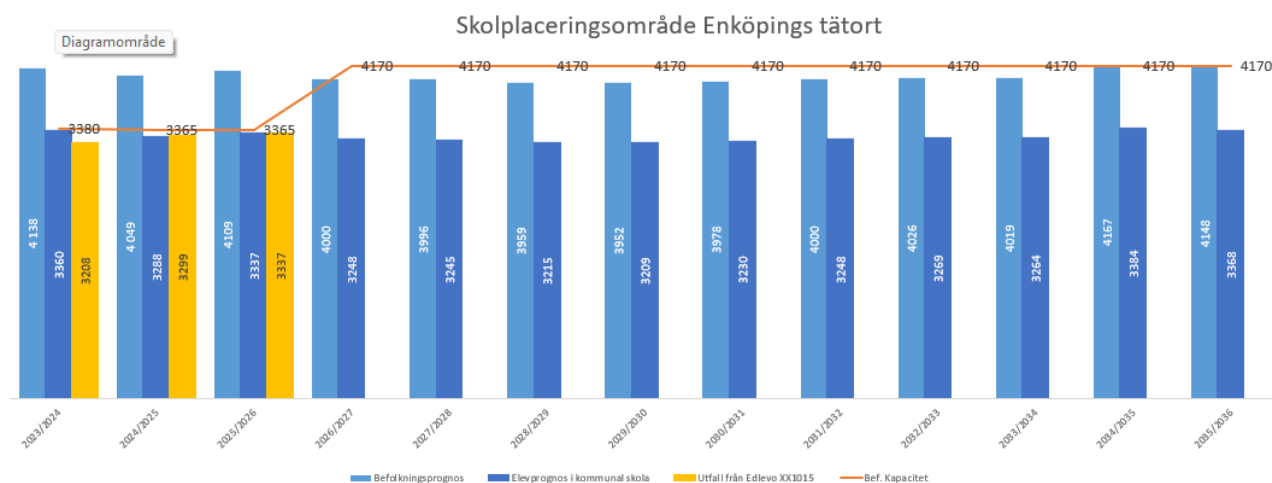

Figuren ovan visar elevprognos i Enköpings tätort mellan 2023–2035. Kapacitetsökning på Bergvretensskolan med 235 platser och en kapacitetsökning på Korsängsskolan med 200 platser finns med i grafen. Den gula och mörkblå stapeln inkluderar inte anpassade grundskolan. Obs! Friskolor är ej inkluderat i grafen.

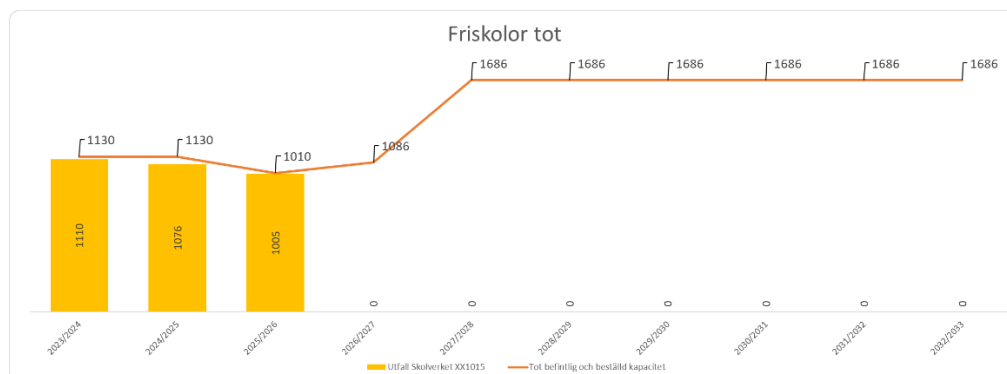


Figuren ovan visar antal inskrivna på friskolorna i Enköpings kommun mellan åren 2023–2025.

4.2 Verksamheter och lokaler – per område

4.2.1 Bergvretens placeringsområde

Bergvretens skolan har de senaste åren renoverats och färdigställdes 2023. I och med renoveringarna har skolan fått en något utökad kapacitet. För att klara efterfrågan i området behövs ytterligare en kapacitetsökning. Många elever från Korsängsområdet går på Bergvreten och vice versa. Vi ser även att några elever söker sig hit under pågående termin från privata aktörer. I området finns det behov av en kapacitetsökning

Tillfälliga paviljonger tillkom som evakuering under renoveringarna men bygglovets har förlängts för att klara lokalbehovet tills en permanent lösning är färdigställd. En förstudie för renovering och kapacitetsökning av kök och matsal samt ytterligare en förstudie för kapacitetsökning av skolan och förstärkning av utemiljön är nu godkänd och projektering pågår. När den planerade kapacitetsökningen står klar 2029 kommer skolan ha en ny kapacitet på 1000 elever.

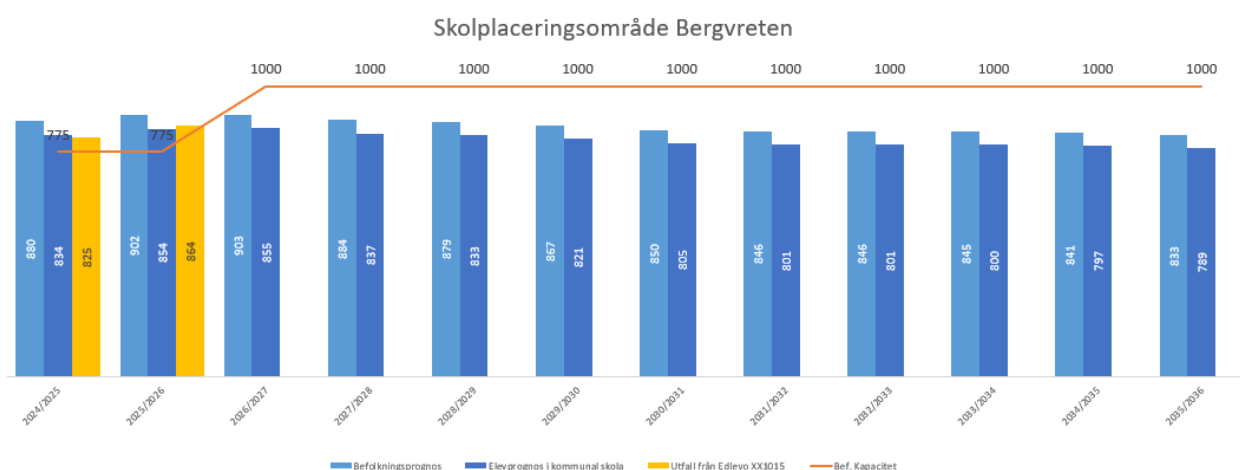

Figuren ovan visar elevprognos årskurs F-9 i Bergvretens placeringsområde under perioden 2024–2035. Grafen inkluderar den

ökning som planeras vara färdigställd 2029 med tillfälliga moduler från 2026.

Lokalernas skick

Lokalerna är gott skick och har renoverats etappvis senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.

Köket är i behov av kapacitetsökning och renovering.

Vissa salar är väldigt små och möjligheten att tillskapa större rum behöver ses över. Vissa rum är också väldigt lyhörda.

Utemiljön har fått en upprustning under året men behöver ses över i samband med nybyggnation.

Planerade förändringar

Temporära:

Paviljonger som ersätter klassrum tills den permanenta kapacitetsökningen står klar. Den innefattar även klassrum som tas i anspråk när kök och matsalsrenoveringen börjar.

Permanent:


Kapacitetsökning av kök och matsal planeras till 2027 och en kapacitetsökning av skolan och en förstärkning av utemiljön planeras till 2029.

4.2.2 Enögla placeringsområde (lokaliserad i gamla Västerledsskolans lokaler)

Enöglaskolan har bedrivit sin verksamhet i Västerledsskolans lokaler sedan 2015. Beslut togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på att bygga en ny skola som ska stå klar 2026 och ha en kapacitet på 930 elever vilket även inkluderar platser för den anpassade

grundskolan. Byggnationen har nu påbörjats. Området kommer att växa framöver och behovet av att ersätta skolan samt kapacitetsöka finns.

Årskurs 7–9 på Munksundsskolan går till Enöglaskolan. Även årskurs 7–9 från Hummelstaskolan kommer gå dit med start ht 2026 med början av elever i åk 7.

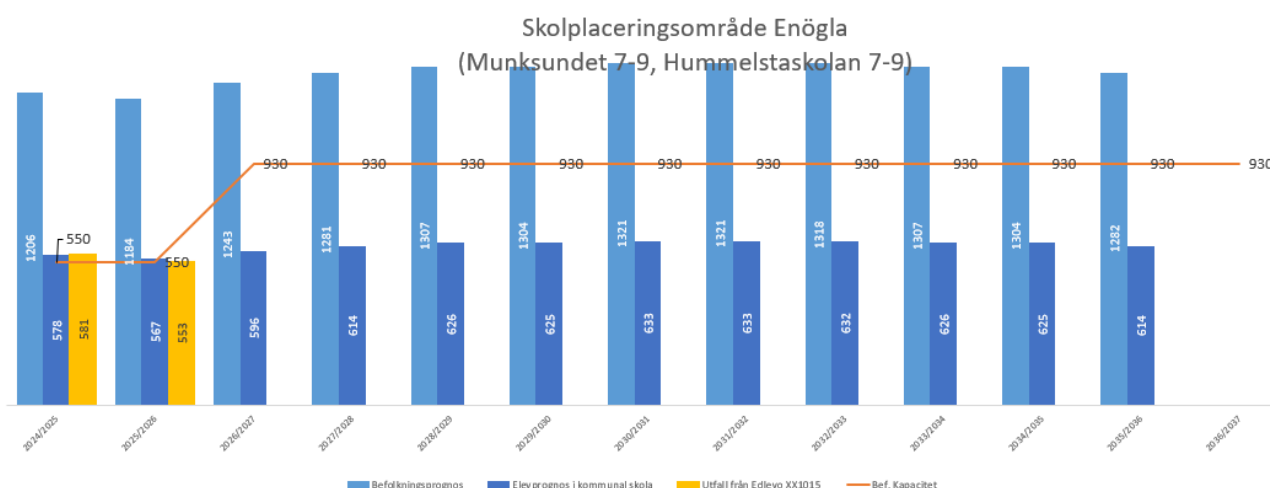

Figuren ovan visar elevprognos, årskurs F-9 i Enöglas placeringsområde, samt 7-9 i Munksundet under perioden 2024–2035. Kapaciteten i grafen inkluderar även platser för anpassade grundskolan. De mörkblå och gula stapeln är dock enbart för grundskolan.

Lokalernas skick

Lokalerna är utdömda och kommer att rivas när nya skolan står klar. Mindre anpassningar kan behöva ske av lokalen så verksamhet kan bedrivas där till 2026.


Planerade förändringar

Permanent:

Ny grundskola med plats för 930 elever (inkl. anpassade grundskolan) kommer stå klar 2026.

4.3.3 Fjärdhundra placeringsområde

Fjärdhundraskolan har idag ett underskott på elever jämfört med antal som det finns kapacitet för. Lokaliseringen av skolan gör att det är svårt att avlasta centrala skolor. Under våren 2020 infördes omvänd skolskjuts men det är bara några få elever som väljer att åka ut till Fjärdhundraskolan. Skolan ser ut att klara av efterfrågan av platser de närmaste 10 åren.

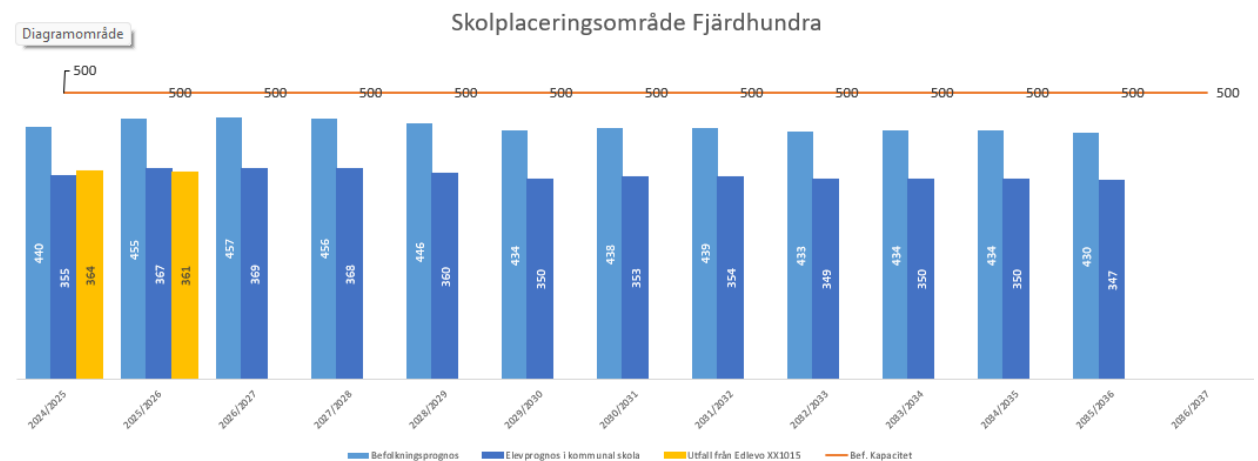

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-9 under perioden 2024–2035 för Fjärdhundra placeringsområde.

Lokalernas skick

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis senaste åren. Driftunderhållet fortsätter kontinuerligt.

De passar bra för den verksamhet som bedrivs.

Ett arbete med att förstärka utemiljön har pågått och är nu färdigställt.

Asfaltsplanen vid parkeringen har fått stängsel så inte bollar hamnar på parkeringen. Även 2 fotbollsmål och några sitttytor har tillkommit.


En av byggnaderna har fått nya markiser då de gamla vara i behov av att bytas ut. Utemiljön är nu i gott skick.

Planerade förändringar

Inga planerade förändringar finns i området.

4.2.4 Grillby placeringsområde

Skolan fick tillgång till fler klassrum 2021 när förskolan flyttade till nya lokaler. Detta gjorde att skolan har kapacitet att klara elevantalet framöver.

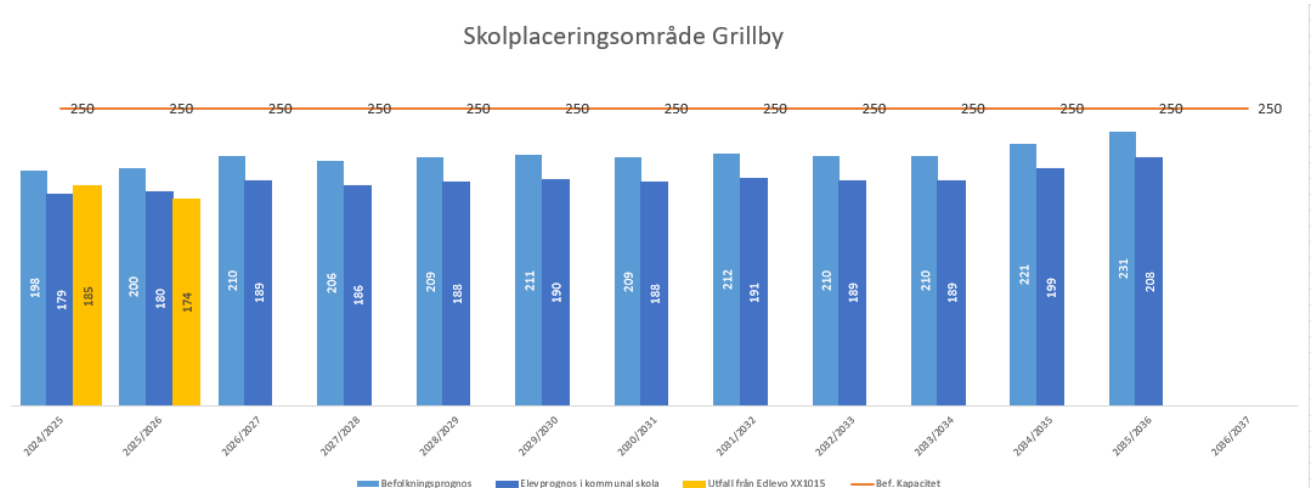

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 under perioden 2024–2035 för Grillbys placeringsområde.

Lokalernas skick

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis senaste åren. Driftunderhållet fortsätter kontinuerligt.

Just nu pågår Enoffprojektet på skolan där åtgärder för att minska energianvändningen görs. I samband med detta kommer ventilationen ses över och därmed öka personbelastningen i vissa rum för att öka nyttjandegraden på dessa rum och göra dem mer ändamålsenliga.

Utemiljön/lekmiljön har förstärkts under 2023/2024 och kommer att fortsätta även under 2025 år.

Även parkeringen behöver ses över då den idag är relativt liten med få parkeringar. Själva körningen på parkeringen innebär även backning vilket är en trafikrisk. Ett rivningsbeslut gällande gamla brandstationen som ligger i anslutning till parkeringen är nu taget i Tekniska nämnden vilket gör att möjligheten att förbättra parkeringen kommer att ses över.

Planerade förändringar

Permanent:

Utredning av förbättring av parkering genom utökning av fler parkeringar samt mer trafiksäker körning.

4.2.5 Hummelsta placeringsområde


Historiskt sett har många valt andra skolor i tätorten men under de senaste åren väljer fler att gå på Hummelstaskolan. En orsak kan vara den nya förskolan och att deras förskolebarn fortsätter att gå i området även i grundskolan. Det här innebär dock att skolans lokaler börjar bli trånga. För närvarande hyr skolan en lokal på andra sidan gatan för bl.a. bibliotek och musik.

Förskoleklasserna bedriver sin verksamhet i moduler som har blivit permanenta.

Elevantalet kommer öka de närmaste åren. Prognosen visar på att en vidare utredning kring möjlig kapacitetsökning behövs.

Skolan har idag ca 12–13 helgrupprum men skulle behöva 14 helgrupprum plus ytor för musik, bibliotek och fritids. I det 13:e rummet behöver ventilationen ses över för att kunna nyttjas som klassrum. Förhoppningsvis kan det ses över i Enoffprojektet som planeras till 2027.

En begränsning för kapaciteten är även köket som idag klarar ca 280 elever. Utökas skolan mer än det kommer köket behöva tex större ugn och extra kokkärl. Själva matsalen klarar den förväntade kapaciteten.

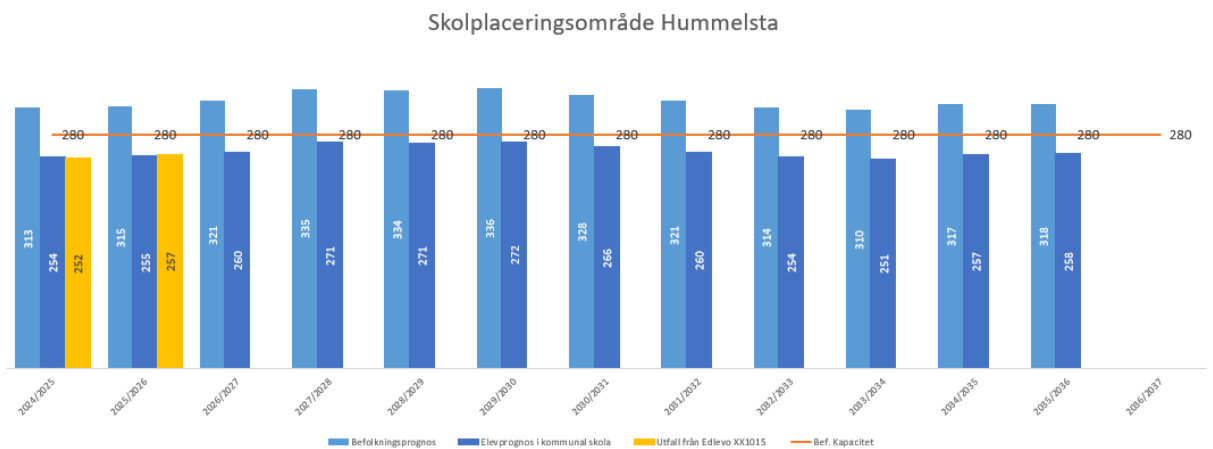

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 under perioden 2024–2035 för Hummelstas placeringsområde. Skolan har idag 12 + 1 helgrupprum men skulle behöva 14 + yta för musik, bibliotek och fritids. Begränsas idag av kökets kapacitet som är 280.

Lokalernas skick

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.

Den länga där förskoleklasserna bedriver sin verksamhet är moduler som blivit permanenta. Här har ventilationen setts över under 2024 och viss renovering har skett. Svårt att säga hur länge denna länga kan stå trots renovering.

De externa lokaler som nyttjas av skolan är ej ändamålsenliga och svåra att anpassa.

Mindre anpassningar har skett i utemiljön och den är nu i gott skick.

Planerade förändringar

Temporära:

Från 2028 kommer skolan troligtvis behöva ett till klassrum men kan då kanske nyttja förskolans lokaler.

3030 kan det vara så att de kan fortsätta nyttja förskolans lokaler alternativt så behövs moduler tills en eventuell permanent lösning står

kvar. Om förskolan ej har plats kommer paviljonger och en nybyggnation/ombyggnation behövas.

Permanent:


En ombyggnation/nybyggnation kan bli aktuell 2032.

En utvärdering av de privata aktörernas påverkan samt de fakta att Hummelstaeleverna från hösten 2026 tillhör Lillsidan behöver ske innan en förstudie beställs.

4.2.6 Korsängens placeringsområde

Korsängsskolan är en av kommunens största skolor och har under flera år utökats i närliggande lokaler. När skolan växer ytterligare har behovet av fler specialsalar uppkommit. Behovet av en kapacitetsökning i området är stort.

En ombyggnation för Nyborgsskolans C-hus har nu upphandlats och planeras att färdigställas under sommaren 2025. Trots denna kapacitetsökning kan det finnas ett behov av att utöka hemkunskapen men det pågående projektet behöver stå klar för att kunna utvärdera det behovet. När den planerade kapacitetsökningen är klar kommer skolan ha en kapacitet för 1000 elever.

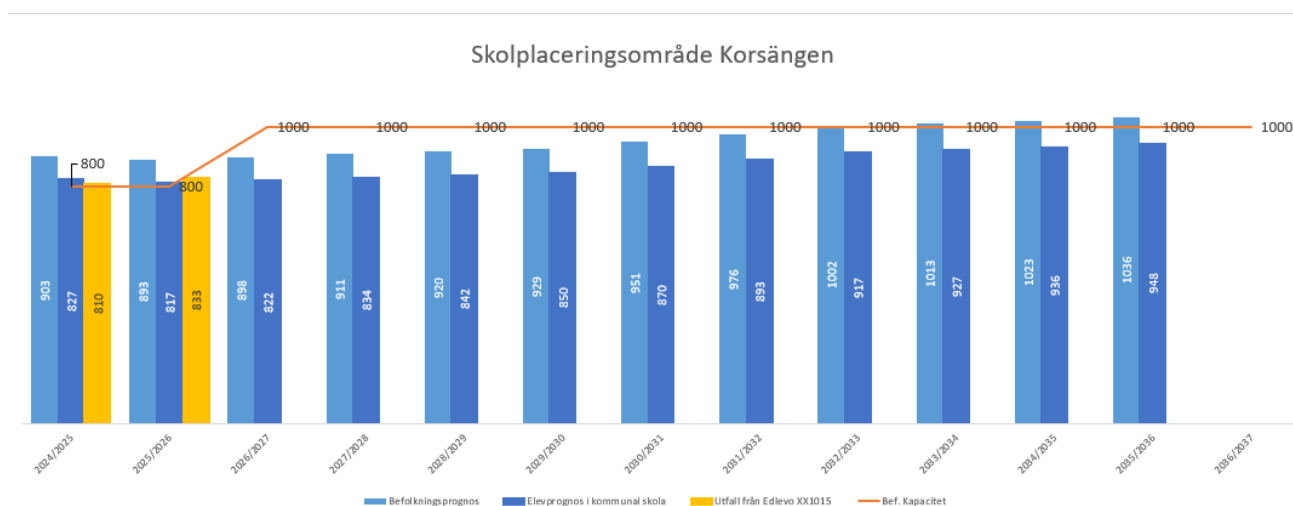

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-9 i Korsängens placeringsområde under perioden 2024–2035

Lokalernas skick

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt. Korsängsskolan är i viss mån yttineffektiv då det är en skola med långa korridorer. Byggnaden saknar även en del grupprum som är önskvärt för att kunna bedriva en bättre undervisning.

Under året har utemiljön förstärkts med bl.a en multiarena, gagarink och sittmöbler och är nu i gott skick.


Planerade förändringar

Permanent:

Utökning i C-huset på Nyborgsskolan när gymnasiet flyttade 2024. Här kommer det finnas arbetsplatser för Modersmåsenheten, Grundskolestöd och Naturskolan. Naturskolan kommer även ha sitt material här. Rörelserum och makerspace för Korsängsskolans elever kommer tillskapas. Även de elever som tillhör central särskild undervisningsgrupp inom Grundskolestöd kommer hålla till här.

4.2.7 Lillkyrka placeringsområde

Många elever i placeringsområdet väljer att gå i en annan skola. Det kan bero på att placeringsområdet är stort, och en del elever kan ha närmare in till Enköping än till Lillkyrka och väljer därför en annan skola. Under 2019–2020 genomfördes några mindre renoveringar och ombyggnationer, exempelvis tillskapandet av några grupprum, för att öka flexibiliteten på skolan. Sett till antal klassrum klarar skolan framtida kapacitetsbehov men idag begränsas kapaciteten av personbelastningen i ventilationen. Viss justering skedde 2025 men ytterligare åtgärder ses över i Enoffprojektet som planeras till 2027.

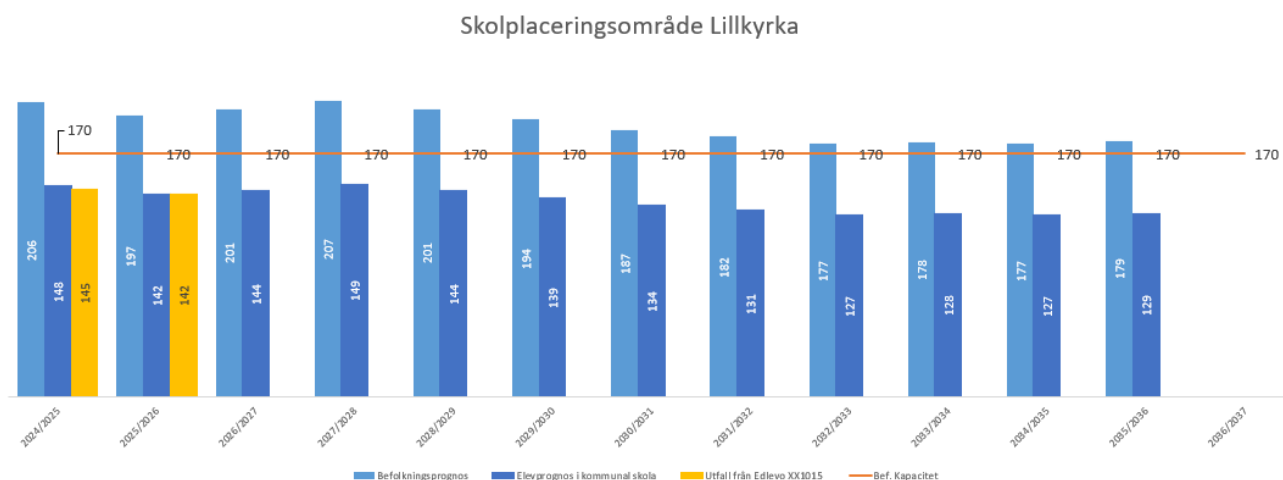

Figuren ovan visar elevprognos årskurs F-6 under perioden 2024–2035 för Lillkyrkas placeringsområde.

Lokalernas skick

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.

En mindre anpassning av ventilationen gjordes 2025 och förberedelser ses över för större anpassningar för att ha beredskap när behovet blir aktuellt. Åtgärder ses även över i Enoffprojektet. Utemiljön är i gott skick.


Planerade förändringar

Permanent:

Utreda kapacitetshöjande åtgärder i form av utökad ventilation. Tas i samband med Enoff

4.2.8 Munksundets placeringsområde

Munksundsskolan flyttade in och startade sin verksamhet i den nybyggda skolan i februari 2018. Arbetet med skolgården blev färdigställt till sommaren 2018.

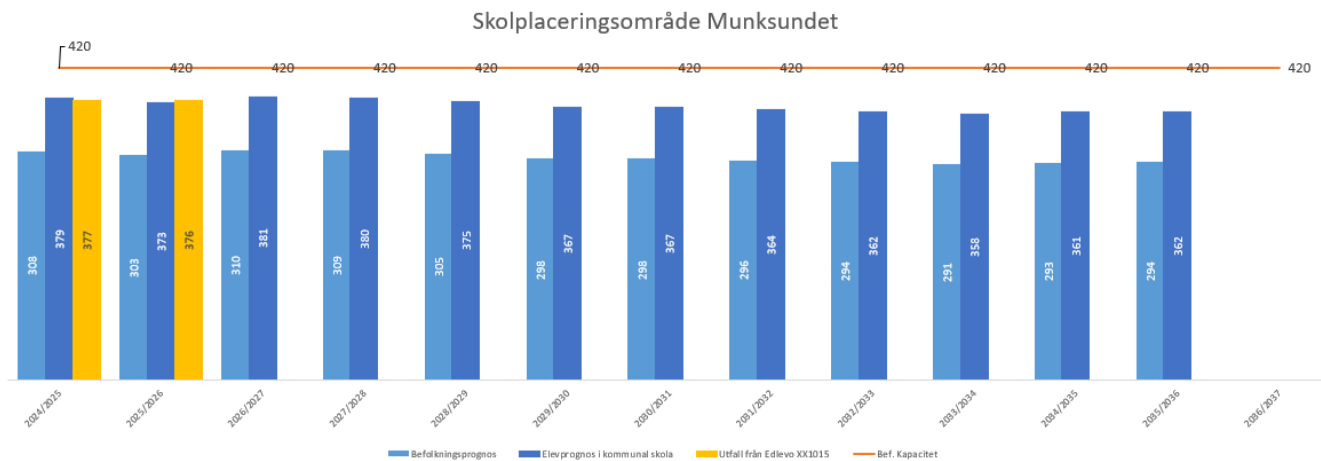

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 i Munksundets placeringsområde under perioden 2024–2035.

Lokalernas skick

Lokalerna och utemiljön är i gott skick och möter verksamhetens behov.

Utemiljön har haft en hel del brister sedan nybyggnationen men som nu är åtgärdat.

Planerade förändringar

Inga planerade åtgärder i området.


4.2.9 Romberga placeringsområde

Från år 2020 är Rombergskolan en F-3 skola. Från årskurs 4 är upptagningsskolan St Ilianskolan. Förändringen var ett led i att lösa den platsbrist som har funnits på skolan. Byggnaden har idag en möjlig kapacitet på 280 elever, men skulle behöva kompletteras med fler grupprum för att kunna bedriva en bättre undervisning.

Utemiljön är idag väldigt begränsad till ytan enligt Boverkets rekommendation. I angränsning till skolan finns en yta som idag används av skolan under skoltid men som tillhör andra förvaltningar inom kommunen. Skolan har nu tagit över driften på delar av dessa ytor för att öka friytan.

Skolan upplevs idag som trång, dock minskar kapacitetsbehovet de närmaste åren. Skolan har idag 12 helgrupprum som skulle kunna ge plats åt 300 elever.

Både köket och matsalen sätter en begränsning på ca 280 elever. Även om kökets kapacitet ökar så finns inte kapaciteten i själva matsalen

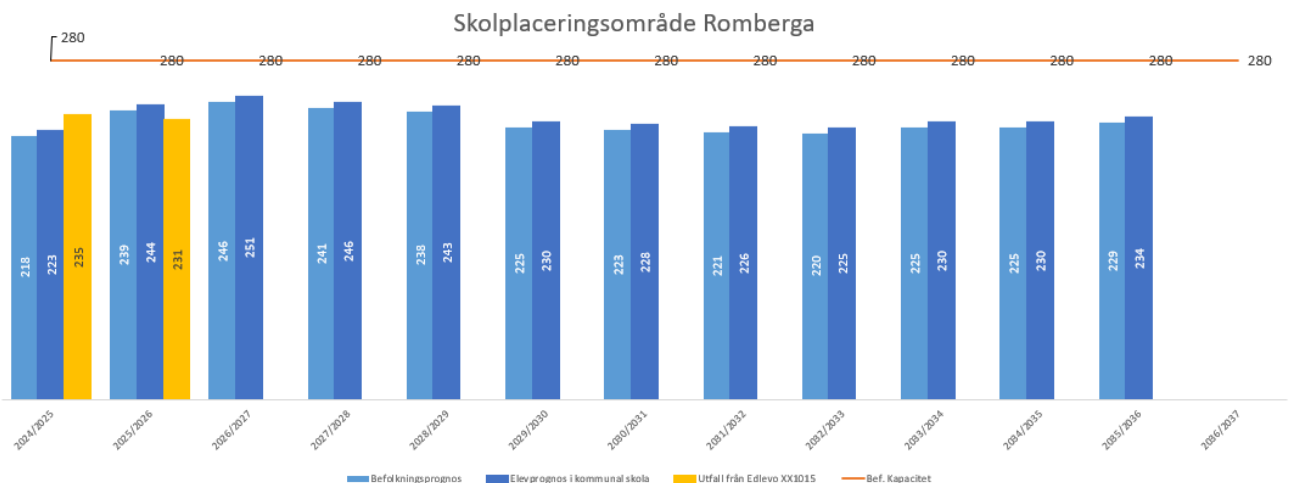

och är svår att anpassa.

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-3 i Rombergas placeringsområde under perioden 2024–2035. Skolan har idag 12 helgrupprum men begränsas av köket och matsalens kapacitet som är 280 idag.

Lokalernas skick

Lokalerna är i gott skick och har renoverats etappvis de senaste åren. Det saknas grupprum för att kunna bedriva en bra undervisning.

Utemiljön är något begränsad men man använder närliggande område för exempelvis bollsporter. Mindre anpassningar har skett och den är nu i gott skick.

Planerade förändringar

Permanent:


Skolan är trångbodd och kapaciteten kan komma att behöva ses över på sikt.

4.2.10 Skolsta placeringsområde

Skolstaskolan är en eftertraktad skola. I området bor många som pendlar till andra orter och skolan ligger längs vägen till motorvägen.

Idag har skolan 12 helgrupprum och 2 halvgrupprum vilket ger en verksamhetskapacitet på 330 elever, men begränsas av köket då även förskolan nyttjar det. Därför är kapacitet skriven till 260.

Skolsta förskola som ligger intill Skolstaskolan är planerad att ersättas med en nybyggd förskola 2030. När förskolan flyttar ut var tanken att skolan skulle ta över förskolans gamla lokal för att möta lokalbehovet. När verksamheten nu har tittat närmare på sin organisation, sina lokaler och elevprognos så ser de att nuvarande lokaler kan möta lokalbehovet i alla fall närmaste 10 åren. Detta under förutsättning att en mindre omorganisation sker. Flytten innebär att skolan kan nyttja hela köket och matsalens, vilket ger en kapacitet på 330 för skolan. För att uppnå 330 i kapacitet behöver dock förskolan flytta in i nya lokaler, och ytterligare åtgärder även ses över så som friyta och kapprum. Detta har det tagits höjd för i Hyresgästanpassningsbudgeten.

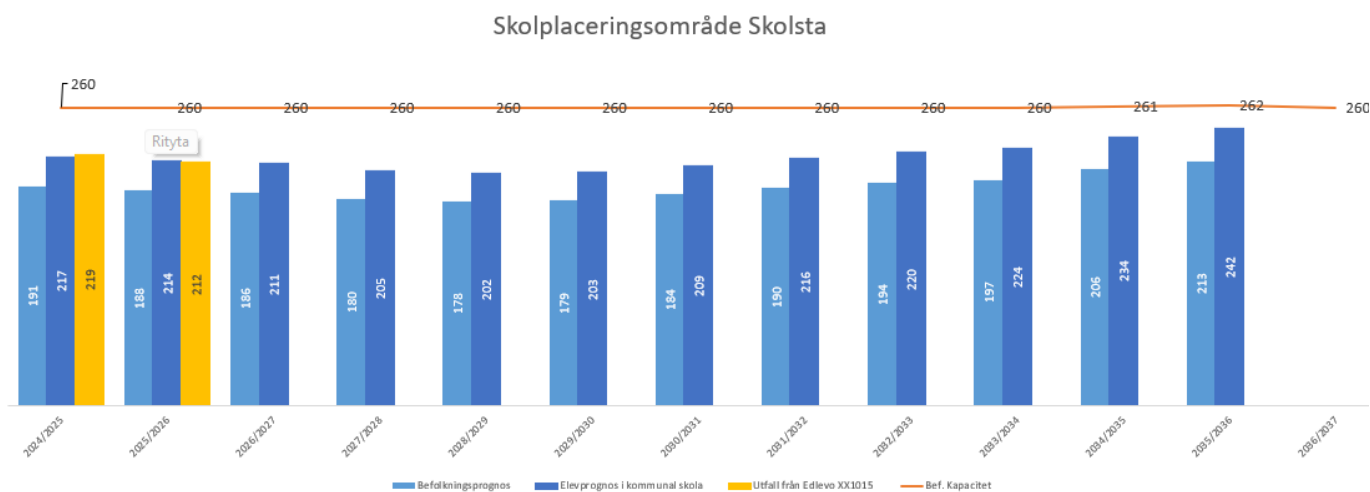

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 under perioden 2024–2035 i Skolsta placeringsområde.

Lokalernas skick

Lokalerna är i gott skick.

Anpassningar i utemiljön gjordes under 2024.

Planerade förändringar

Permanent:


Inga planerade lokalförändringar men en utökning av friyta och kapprum kan bli aktuell på sikt.

4.2.11 S:t Ilians placeringsområde

St Ilianskolan är en 4–9 skola med upptagningsområde Romberga årskurs 4–9, Lillkyrka, Grillby, Skolsta, Romberga och Hummelsta årskurs 7–9. Från och med hösten 2026 kommer Hummelstaeleverna gå till Lillsidanskolan i stället. Viss anpassning för att kapacitetsöka skolan har gjorts, bland annat genom att dela av ett rum till två.

Idag är fördelning två helgrupper i årskurs 4–6 och fem helgrupper i årskurs 7–9. Med en organisation på tre helgrupper i årskurs 4–6 och fem helgrupper i årskurs 7–9, ca 25 elever i varje grupp, klarar skolan rent teoretiskt en kapacitet på 600 elever. Detta begränsas dock av bland annat matsalen, friytan och att skolan idag lånar ut teori- och specialsalar till andra skolor vilket gör det svårt att schemalägga. Därför är kapaciteten skriven till 540 vilket är matsalens kapacitet i dagsläget. Möjlighet till att utöka matsalen inom befintlig byggnad är under utredning vilket kan medföra en kapacitetsökning till 600.

Om det däremot blir en helgrupp till, framför allt på högstadiet, så kommer inte skolan lokaler att räcka till.

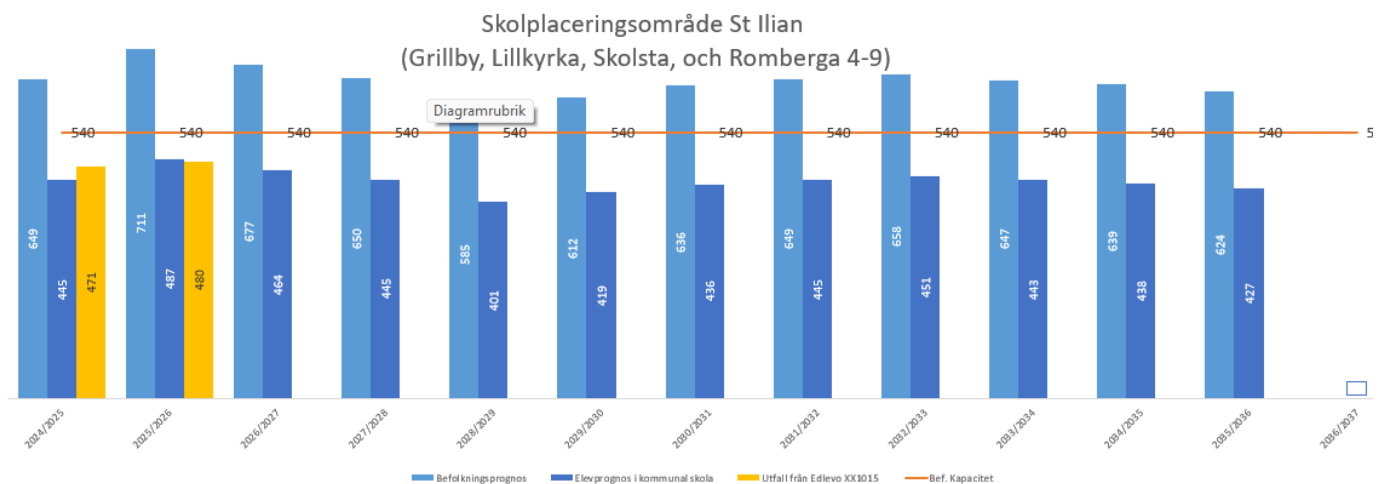

Figuren ovan visar elevprognos i S:t Ilians placeringsområde - årskurs 7–9 för Grillby, Lillkyrka, Skolsta, och Hummelsta, samt 4–9 för Romberga, under perioden 2024–2035. From hösten 2026 är nya elever från Hummelsta borttagna.

Lokalernas skick

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.

Lokalerna är relativt ytineffektiva då det är en skola med långa korridorer. Utemiljön är i gott skick.

Planerade förändringar


Permanent:

Inga planerade förändringar finns

4.2.12 Örsundsbro placeringsområde

Örsundsbro är ett område som har goda möjligheter att växa. En viktig förutsättning för fortsatt befolkningsökning är att det finns fler skolplatser i området. En del av skolan utgörs av paviljonger och en del huskroppar är byggda på 60-talet.

I februari 2023 antogs programhandling av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för ny grundskola i Örsundsbro med planerad inflytt 2026. Den ska ersätta de befintliga byggnaderna som har nått sin tekniska livslängd och behöver kapacitetsökas. Under perioden fram tills att den nya skolan är klar kommer paviljonger och tillgång till gamla Örsundsbro förskola behövs för att lösa det ökade kapacitetsbehovet och ersätta de lokaler som ska rivas. I juni 2023 återremitterade Kommunstyrelsen ärendet vilket ledde till försening i nybyggnationen med minst ett år. Evakuering av verksamheten, och byggnationen har nu börjat och planen är nu att nya skola ska stå klar 2027. Behovet av att ersätta befintlig skola samt kapacitetsöka i området är stort.

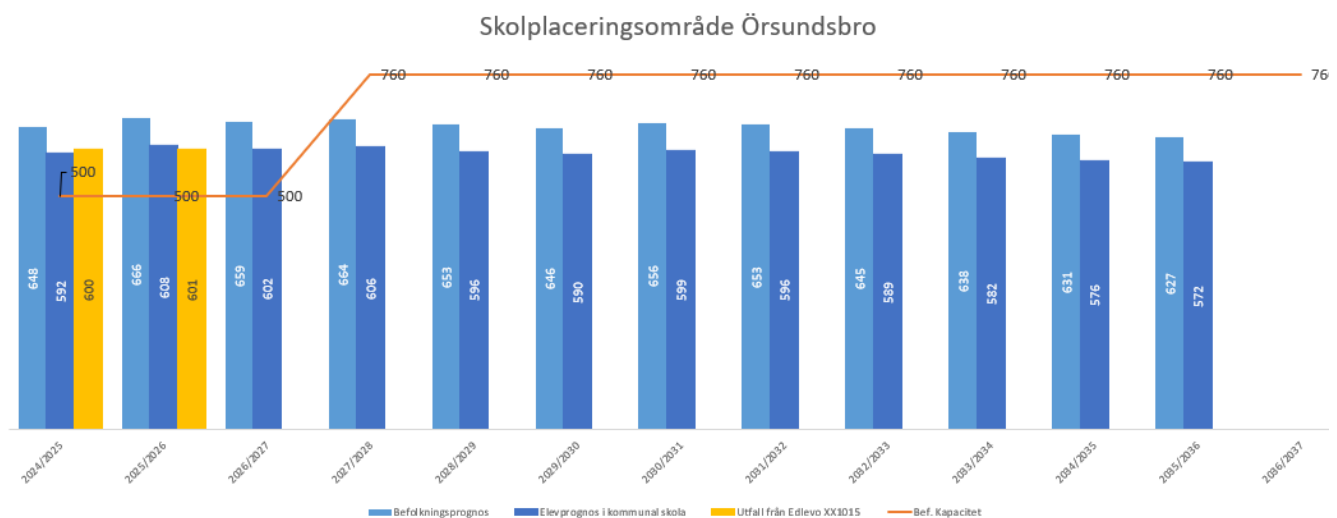

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-9 samt kapaciteten under perioden 2024–2035 för Örsundsbro's placeringsområde.

Lokalernas skick

Större delar av lokalerna är utdömda och kommer att rivas när nya skolan står klar. G-huset kommer dock att renoveras.

Planerade förändringar

Temporära:

Evakuering i paviljonger och Örsundsbro gamla förskola under byggnationstiden.


Permanent:

Ny grundskola under byggnation med plats för 760 elever kommer att stå klar 2027.


4.2.13 Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns idag på två ställen: Enöglas anpassade grundskola på Enöglaskolan, och träningsskolan på Bergvretensskolan. Båda skolorna kommer flyttas till den nya Lillsidanskolan som byggs i västra Enköping och är klar för inflytt 2026. Kapaciteten på respektive skola är svår att fastställa eftersom den beror på varje elevs individuella

behov. Även hur lokalerna måste anpassas till hjälpmedel etc. är svåra att beräkna. Idag är anpassad träningsskola trångbodd och fram till att den nya anpassade skolan står klar har verksamheten tillfälligt utökat sin verksamhet i gamla Petterslunds förskolas lokal.

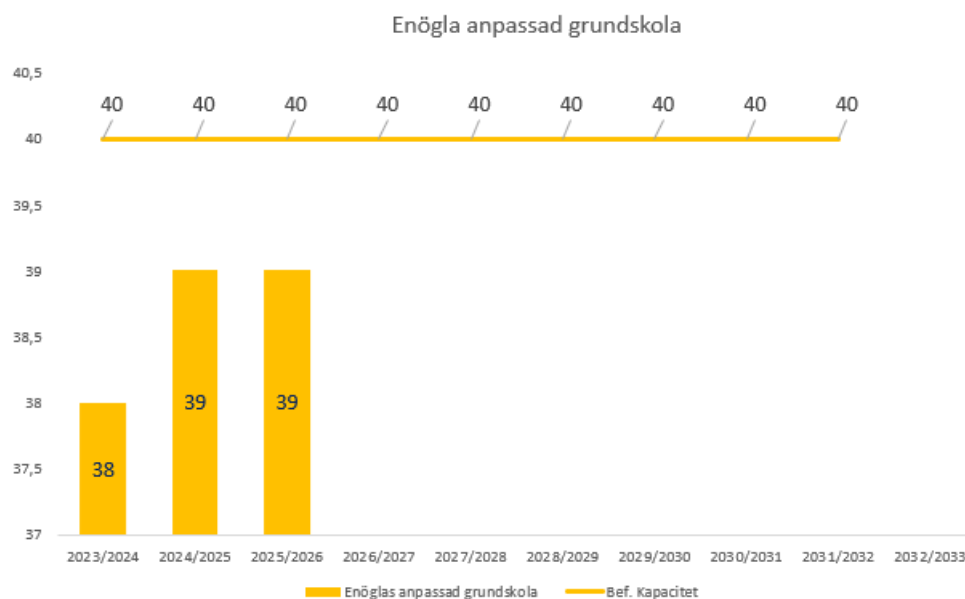

Figuren nedan visar antal inskrivna på Enöglan anpassad grundskola under perioden 2023–2025.

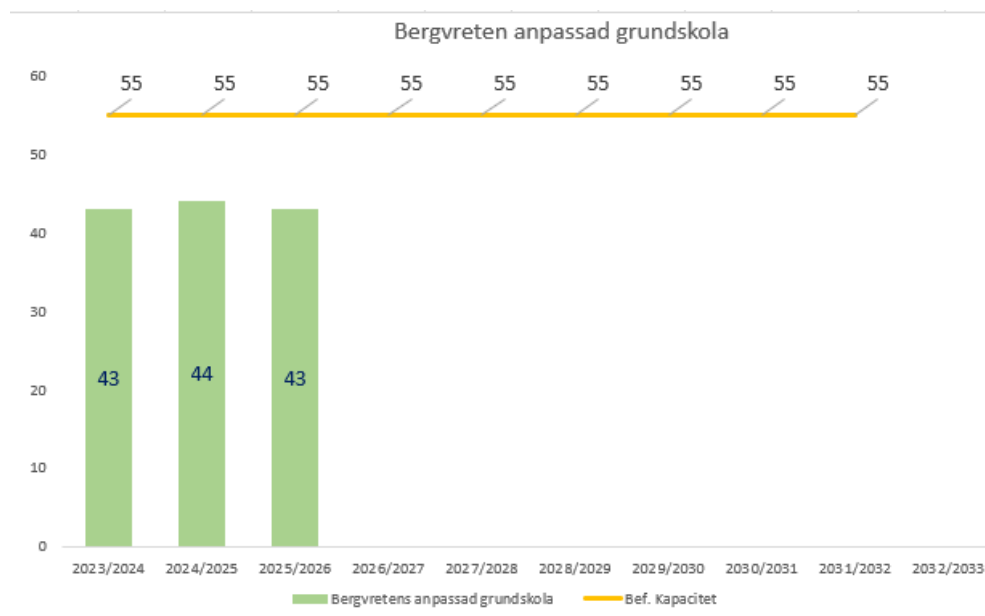

Figuren ovan visar antal inskrivna på Bergvretens anpassade träningsskola under perioden 2023–2025.

4.3 Framtida utveckling

De senaste befolkningsprognoserna har pekat på ett ökat barn/elevantal i Enköpings kommun dock inte i samma takt som tidigare, vilket påverkar det långsiktiga arbetet med lokalförsörjning.

Befolkningsökningen de senaste åren innebär ett behov av kapacitetsökning på flera av kommunens grundskolor. De grundskolorna med behov av kapacitetsökning framöver är främst Korsängsskolan, Bergvretensskolan och Hummelstaskolan.

Ny grundskola

En förstudie av 3 möjliga tomter för ny grundskolan presenterades i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i december 2024. En tomt vid gamla Sandbroskolan, en på Korsängsfältet och en Storskogen. Planen var att göra en utredning om vilken typ av enhet som behövs och om det kanske ska vara 2 mindre enheter i stället för en samt vilken eller vilka av dessa tomter som är lämpliga att använda. Även

upptagningsområdena behövde ses över och kanske ändras. Planen var att detta skulle vara klart så att man kunde beställa en förstudie våren 2026.

Just nu planerar en fristående aktör att öppna en ny enhet för ca 580 elever i åk f-9 i Storskogen. Enheten planeras ska stå klar 2027.

Detta kommer i sin tur påverka beläggningen och sökmönstret för våra befintliga skolor, därför behöver utredning vänta tills utbildningsförvaltningen ser mer hur den fristående aktörernas etablering påverkar dem. Därför skjuts utredningen och förstudiebeställningen på framtiden.

4.3.2 Planerade och beslutade projekt

Skola	Projekt	Verksamhetsst art	Status
Örsundsbro skolan	Nybyggnation, kapacitetsökning	HT-27	Byggnation pågår
Bergvretens skolan kök och matsal	Nybyggnation, ombyggnation, kapacitetsökning	HT-27	Projektering pågår/Upphandling februari -26
Bergvretens skolan	Ombyggnation/r enovering, kapacitetsökning	HT-29	Projektering pågår/ Upphandling hösten - 26
Hummelstaskolan paviljonger	Tillfällig lösning tills permanent lösning står klar	HT-30	Avvaktar
Hummelstaskolan	Nybyggnation, ersättning	HT-32	Avvaktar

Under 2026 kommer Lillsidan och Korsängsskolan (Nyborg C) stå klara för inflytt. Därför finns de ej med i tabellen ovan.

4.3.3 Framtida möjliga projekt

I planeringen efter investeringsbudgeten 2027–2036 finns även nedan projekt med.

Skola	Projekt	Verksamhetsstart	Status
Ny grundskola Enköpings tätort*	Nybyggnation	2040**	Avvaktar

**En förstudie för en lokaliseringsutredning är gjord och en behovsutredning utifrån dessa tomter kommer att påbörjas när vi ser hur den nya fristående aktörens etablering påverkar.*

*** Förutsatt att man kapacitetsökar Korsängen Nyborg C-hus och Bergvretensskolan som planerat. Annars behöver projektet tidigareläggas.*

5. Gymnasieskolan



Visualisering nya Westerlundska gymnasiet.

5.1 Nuläge

I Enköping finns idag en gymnasieskola, Westerlundska gymnasiet som stod klar med sin huvudbyggnad för inflytt i juni 2024. Det är en byggnad med plats för ca 1600 elever.

Lokaler för anpassad gymnasieskola ligger integrerat inne i huvudbyggnaden för Westerlundska gymnasiet och erbjuder 45 platser (inräknat i de 1600 platserna ovan). Eleverna kommer från anpassad grundskola.

I nybyggnationen ligger också LSS verksamheten som bedrivs på eftermiddagar/kvällar/helger/lov för dessa elever.

Utöver den nybyggda skolan finns även olika lokaler för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet placerad i olika lokaler i centrala delar av staden.

5.1.1 Kapacitet

	Antal elever 2022	Antal elever 2023	Antal elever 2024	Antal elever 2025
Westerlundska gymnasiet	1313	1393	1401	1550

Tabellen ovan visar antal inskrivna för Westerlundska gymnasiet.

Antalet elever på Westerlundska gymnasiet var i oktober 2025 elever inklusive 41 elever på anpassade gymnasiet.

Program/lokal	Huvudman	Kapacitet	Inskrivna oktober 2025
WGY huvudbyggnad	K	1600*	1359
Fordonsprogrammet	K	96	66
Bygg och anläggningsprogrammet	K	96	82
Restaurang och livsmedelsprogrammet	K	54	43
SUMMA		1846/1750**	1550
*Ink 40 platser på anpassade gymnasiet			

*** Eftersom Yrkesprogrammen använder en del av teorisalarna på WGY så är den totala kapaciteten satt till 1750. En siffra som behöver säkerställas inför framtiden.*

Totalt har Westerlundska gymnasiet en kapacitet för ca 1750 elever en siffra som behöver ses över beroende på hur man tex kan samläsa kurser och använda lokalerna på bästa sätt. Två år framöver så studerar eleverna utifrån två olika läroplaner vilket gör att det är svårt att nyttja

lokalerna optimalt. När den perioden är över så kommer man att kunna samläsa fler kurser och nyttja lokalen mer effektivt.


5.1.2 Sökmönster

Ca 18 % av befolkningen i åldern 16–18 år väljer att gå i gymnasium på annan ort. Siffran skiftar något då vi varje år ser en trend kring hemvändare under de första månaderna på terminen. Målet är att fler elever ska välja Westerlundska gymnasiet och då är det viktigt att i framtiden ha flexibla lokaler där det finns möjlighet att utveckla och utöka verksamheten.


Utöver utpendlingen till andra kommuner och friskolor, finns även en mindre inpendling av elever bosatta i andra kommuner som går på Westerlundska gymnasiet. Inpendlingen bedöms vara ca 4 % av antalet Enköpingsungdomar 16–18 år.

5.1.3 Befolkningsutveckling för elever 16 – 19 år

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 250 elever från 2025 tom 2035.

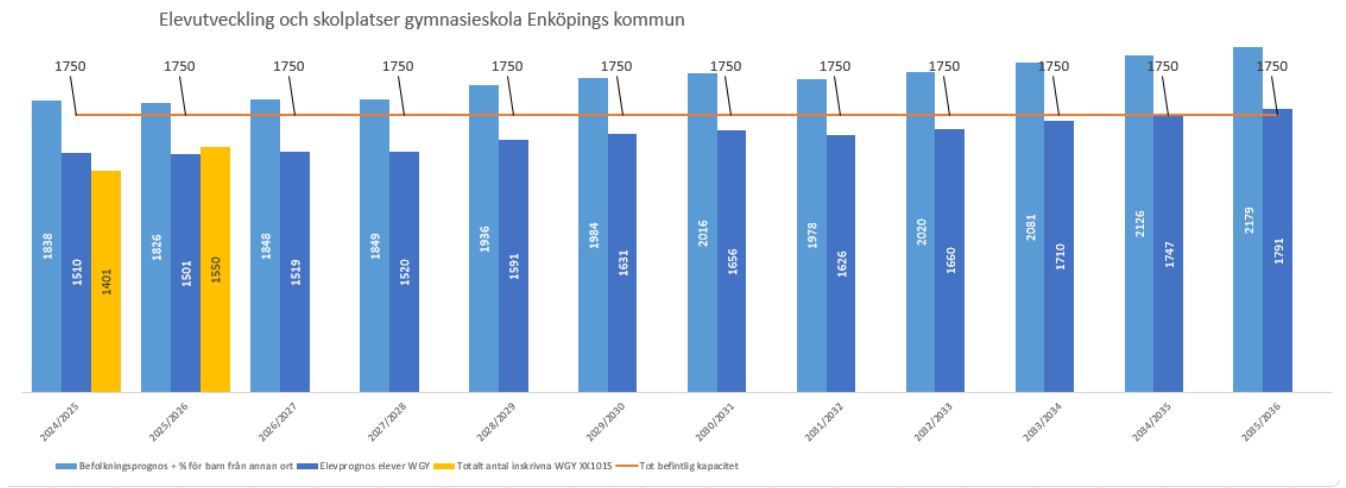

Figuren visar elevprognos för ungdomar 16–18 år, för perioden 2024–2035. Ca 18% väljer idag en annan utförare än Enköpings kommun. Notera att befolkningsprognos (ljusblå stapel) är påslagen med 10% för att ta hänsyn till att ett visst antal kommer från andra kommuner till WGY.

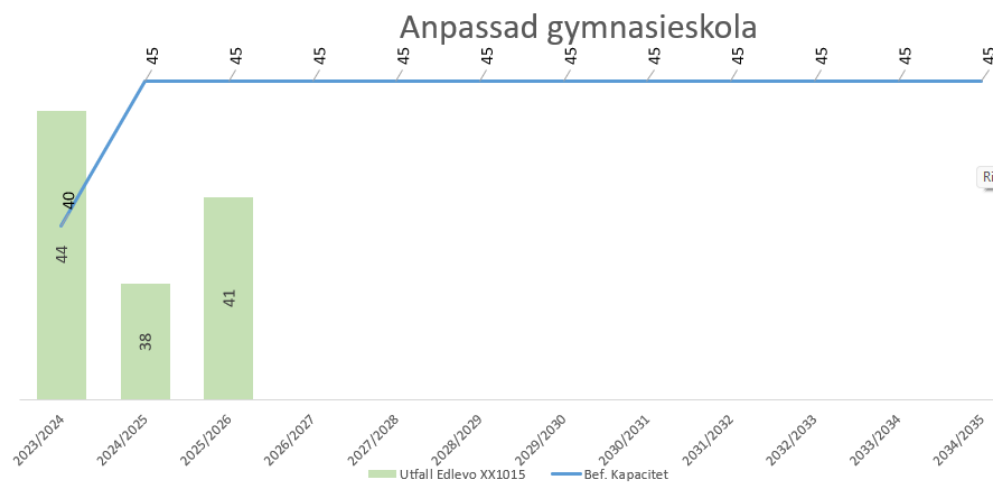

Bilden ovan visar det faktiska utfallet på anpassad gymnasieskola i oktober 2025.

5.2 Verksamheter och lokaler

Förutom verksamheten som bedrivs i huvudbyggnaden för WGY så är verksamheten för gymnasiet utspridd i olika lokaler runt om i centrala Enköping där varje lokal är specifikt anpassad för just den verksamheten.

Lokalernas skick

Westerlundska gymnasiet

Nybyggt gymnasium, inga anmärkningar.

Bygg och anläggningsprogrammet

Nyborg A-hus och delar av C-huset. Lokalerna är i gott skick.

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Extern fastighet, inga anmärkningar.

Fordon och transportprogrammet

Extern fastighet, inga anmärkningar.

Planerade förändringar

Fordonsprogrammet kommer behöva en ny teorisal för helklass, vilket planeras under 2026.

5.3 Framtida utveckling

Ett eventuellt ägarskifte för lokalen för Restaurang och livsmedelsprogrammet kan påverka framtiden om det blir aktuellt.

6. Vuxenutbildningen

6.1 Nuläge

Vuxenutbildningen befinner sig i en extern inhyrd lokal på Östra Järnvägsgatan som kallas Kompetensmagasinet. Här finns Komvux (i Komvux ingår SFI, grundläggande och gymnasiala kurser samt Komvux som anpassad utbildning) Yrkeshögskolan, och Integrationsenheten. Sedan januari 2025 tillhör arbetsmarknadsenheten socialförvaltningen men sitter kvar i sina lokaler.

6.1.1 Kapacitet

Lokalernas fulla kapacitet är nu nådd. Om ytterligare utbildningar skulle ansökas om krävs fler lokaler.

6.1.3 Befolkningsutveckling

Efterfrågan på vuxenutbildning kan relateras till arbetsmarknadens kompetensbehov, krav på omställning och livslångt lärande samt att fler vuxna behöver komplettera eller höja sin utbildningsnivå.

Nya utbildningssatsningar ökar lokalbehovet, men det är svårt att förutsäga om, när och i vilken omfattning som lokaler kommer att efterfrågas.

6.2 Verksamheter och lokaler

6.2.1 Komvux

Lokalerna på Kompetensmagasinet är en blandning av större och mindre rum samt öppna studietor. Här samverkar alla verksamheter för ett bättre lokalutnyttjande. Att ha alla verksamheter samlade på ett ställe

skapar mer flexibilitet över åren beroende på om en del ökar/minskar i elevantal.

6.2.2 Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan (YH) har sin verksamhet i en del av Kompetensmagasinet.

YH:s elevantal kan variera från år till år beroende på vilka utbildningar som bedrivs och hur efterfrågan ser ut. Därför är det viktigt att verksamheten finns i anslutning till Komvux för att kunna samutnyttja klassrum, konferensrum, personalrum samt administration.

På fastigheten finns också en utemiljö som är en tillgång för trädgårdsmästarutbildningarna. Här kan de bygga upp och riva tillfälliga installationer och även ha längre projekt pågå utan att behöva flytta dem.

6.2.3 Integrationsenheten

Integrationsenheten har sina lokaler tillsammans med övriga vuxenutbildningen på Kompetensmagasinet. Ytorna är anpassade för arbetsplatser, mötesrum och större gemensamma ytor.

6.3 Framtida utveckling

Idag finns inga planerade förändringar för vuxenutbildningen. Om ytterligare utbildningar skulle ansökas om krävs fler lokaler, eftersom verksamheterna fyller lokalens kapacitet fullt ut redan idag.

Eftersom fastigheten där verksamheten bedrivs är inhyrd och området på lång sikt planeras att omvandlas till bostäder, finns en viss osäkerhet kring om lokalerna behöver ersättas under andra halvan av 2030-talet.

7. Förslag till Lokalbehovsplan - Sammanvägd behovsbedömning

Lokalbehovet för nedanstående åtgärdsförslag är baserade på prognosen för antal förväntade barn, elever, och vuxna för utbildningsförvaltningens verksamheter. Behovet tar även hänsyn till de kommunens mål och de nationella lagar som styr verksamheterna.

Förskola

Efter renoveringen av förskolorna Salnecke, Gröngarn och Bolmörten samt nybyggnationen av Enögla och Skolsta är vi helt i fas med förskolorna utifrån den befolkningsprognos som vi ser nu.

Vi har inne i Enköping ca 200 tomma platser, vilket ger oss tryggheten av att klara av ev stängning av någon fristående enhet, alternativt en svängning i prognosen. Det ger oss också utrymme för att klara evakueringar under renoveringarna utan några dyra tillfälliga lösningar.

Grundskola

Om de redan beslutade kapacitetshöjande åtgärderna genomförs kommer det 2035 finnas utrymme på ca 700 platser mellan behovet av platser och kapaciteten i kommunala skolor i tätort. Därför bedöms behovet av Ny grundskola kunna skjutas på framtiden efter investeringsperiodens slut.

Skulle sökmönstret ändras och alla elever som finns i kommunen skulle vilja gå i kommunal regi skulle kommunen inte ha några platser i överskott.

Idag placeras barnen i grundskolan utifrån placeringsområden, vilket innebär att barnen har rätt till en plats i den grundskolan i det placeringsområde där de bor. Därför kan eleverna inte hänvisas till närliggande placeringsområde trots att det finns platser där. De har även rätt att gå kvar på den skola de är inskrivna på om skolan erbjuder den årskursen. Därför föreslås att planerade åtgärder genomförs.

Vad gäller Hummelstaskolan så behöver vi avvakta påverkan av ny privat aktör och det facto att Hummelstaeleverna (årskurs 7–9) kommer tillhöra Lillsidanskolan from 2026. Vi ser att skolan behöver ytterligare en teorisal 2028 om nuvarande trend fortsätter men kan lösas med att de nyttjar förskolans lokaler. Om antalet barn på förskolan ökar och inte kan tillhandahålla lokaler för grundskolans räkning så kommer det att behövas moduler 2030 och en nybyggnation behöver då stå klar 2032.

ENHET	TOTAL NY KAPACITET	ERSÄTTNINGS- KAPACITET	KAPACITETS- ÖKNING	PREL VERKS. START	STATUS PROJEKT
SKOLSTA FÖRSKOLA	120	67	53	2028	Upphandling 2025
SALNECKE FÖRSKOLA	80	0	20	2028	Beslut våren 2025
ENÖGLA FÖRSKOLA	160	120	40	2030	Beslut våren 2025
SUMMA	360	187	123		
BERGVRETENSSKOLAN (KÖK/MATSAL)	1100	0	425	2027	Upphandlas februari 2026
BERGVRETENSKOLAN	1000	0	325	2029	Projekteras och planeras upphandlas hösten 2026
HUMMELSTASKOLAN PAVILJONGER	100	50	50	2030	Avvaktar
HUMMELSTASKOLAN	350	50	70	2032	Avvaktar
ÖRSUNDSBROSKOLAN	760	500	260	2027	Byggnation pågår
SUMMA	2210*	600*	705*		

7.1 Åtgärdsförslag till Investeringsplan 2027–2036

* exkl Bergvreten matsal

7.1.1 Projekt efter investeringsplanens slut

ENHET	TOTAL NY KAPACITET	ERSÄTTNINGS-KAPACITET	KAPACITETS-ÖKNING	PREL VERKS. START	STATUS PROJEKT
ROSENS FÖRSKOLA	160	0	160	2037	Tidigt skede, reservation av mark
ENENS FÖRSKOLA	160	0	160	2040	Tidigt skede, reservation av mark
TALLENS FÖRSKOLA	160	0	160	2043	Tidigt skede, reservation av mark
SUMMA NY GRUNDSKOLA TÄTORT**	1000	0	1000	2040	Avvaktar
SUMMA	1000		1000		

** Förutsatt att man kan kapacitetsöka Korsängen Nyborg C-hus och Bergvretensskolan som planerat. Om kapacitetsökningarna inte kan genomföras tidigareläggs projektet.

7.2 Troliga uppsägningar i samband med lokalförändringar

Nedan tabell visar på en sammanställning av de lokaler som har sagts upp under det senaste året eller som eventuellt kommer att sägas upp de kommande åren.

ENHET	TYP AV LOKAL	UTFLYT T	BESLUT
NATURSKOLAN S LOKALER, EHB	Externt inhyrda, administrativa lokaler och förråd	2025	Uppsagd 2024

MARATONGATAN (ENAVALLEN FÖRSKOLA)	KGU och lärandearenans lokaler (tidigare förskolelokaler i sämre skick)	Januari 2027	Uppsagda
STORSKOGEN S PAVILJONGER FANNAGATAN (PETTERSLUND FÖRSKOLA)	Förskolelokaler med temporärt bygglov	Augusti 2026	Uppsagda
PAVILJONGER VÄSTERLEDEN	Lokaler för Lillsidans elever förskoleklass	Januari 2027	Uppsagda
ENÖGLA/VSTERLEDENSKOLAN	Lokaler för Enöglaskolan	Januari 2027	Uppsagda
SKOLSTA FÖRSKOLA PAVILJONG ÖRSUNDSBRO GAMLA FÖRSKOLA	Kommunens egenägda paviljong	2025	Uppsagda
ENÖGLA PAVILJONGER	Evakuering för Örsundsbro skolan (tidigare förskolelokaler i sämre skick)	2027	Kan sägas upp efter evakuering av Örsundsbro grundskola
HUMMELSTA SKOLBIBLIOTEK, EHB	Förskolelokaler med temporärt bygglov	2028	Uppsagda
	Externt inhyrda lokaler för skolbibliotek, fritids, fritidsgård samt musiksal.	2032	Kan sägas upp om utbyggnad av Hummelstaskolan blir aktuell.

8 Ekonomiska och sociala konsekvenser

8.1 Samverkansmöjligheter

Kostnader per kvadratmeter är högre för nybyggnation än befintliga lokaler. Allt eftersom nybyggnation blir en större del av lokalbeståndet, ökar hyreskostnaden per kvadratmeter. Därför är det viktigt att ny kapacitet planeras yteffektivt. Exempelvis genom att samutnyttja ytor kan kommunens totala ytbehov hållas nere, vilket minimerar kostnaden.

S:t Iljansskolans lokaler samnyttjas av flertal kransortsskolor för praktisk-estetiska ämnen. Detta påverkar dock S:t Iljansskolans möjligheter att ta emot fler elever per årskurs.

Nya Lillsidanskolan samnyttjas med anpassad grundskola och initialt finns möjligheter för kransortsskolor att nyttja salar för praktisk-estetiska ämnen.

För ett effektivt lokalutnyttjande eftersträvas samnyttjande med andra förvaltningar där så är möjligt. Redan idag samnyttjas kreativa skollokaler med exempelvis kulturskolan. Idrottshallar som hyrs av Upplevelseförvaltningen används under dagtid av skolan och hyrs på kvällar och helger till föreningslivet. När Lillsidan- och Örsundsbroskolan står klara så kommer lägerstaden att kunna nyttja dessa lokaler för övernattning

När nya lokaler planeras är ökat samnyttjande utanför skoltid en viktig planeringsförutsättning, exempelvis genom att anpassa så att lokalerna blir uthyrningsbara, men också genom att utreda möjligheten att samlokalisera med andra kommunala enheter för att kunna dela på resurser såsom lastzon, tillagningskök, personalrum odyl.

Även skolgårdarna planeras för att kunna användas utanför skoltid och agera som ett komplement till övriga rekreationsområden och lekplatser.

Exempel på lokaler som har planerats för samnyttjande och uthyrning efter skoltid i pågående, planerade, samt nyligen avslutade lokaler är aulan, matsalen och vissa klassrum i Westerlundska gymnasiet, samt lokaler såsom makerspace och rörelserum i projektet för Nyborg C och Bergvretensskolan.

8.2 Konsekvenser om föreslagna investeringar inte prioriteras

8.2.1 Förskola

Genomförs inte de föreslagna investeringarna för förskolelokaler är risken stor att kommunen på sikt inte kan erbjuda de förskoleplatser som invånarna enligt lag har rätt till. Kommunen kommer också riskera tappa den goda framförhållning av framtida förskolelokaler som Enköpings kommun möjliggjort under flertal år. Detta kan leda till kortsiktiga och kostsamma lösningar samt att det kan påverka Enköpings kommuns befolkningsmål negativt.

8.2.2 Grundskola

Genomförs inte de föreslagna investeringarna i grundskolelokaler så kommer kommunen inte kunna erbjuda den plats eleven har rätt till, enligt lag, i Enköpings kommun. Kommunen kommer heller inte kunna tillgodose det fria skolvalet. Beredskapen för förändringar om fler väljer kommunal skola i stället för en privat aktör kommer att minska, vilket kan leda till kortsiktiga och kostsamma lösningar samt att det kan påverka Enköpings kommuns befolkningsmål negativt.

Om kapacitetshöjande åtgärder på Bergvreten- och Korsängsskolan ej genomförs blir behovet av en ny grundskola större. Arbetet med att bygga en ny grundskola är en lång process, vilket innebär att den

behövda kapaciteten inte kan uppfyllas i tid.

Om nybyggnationen av Örsundsbroskolan stoppas så kommer vi inte kunna tillgodose platser för elever i området då de moduler de idag befinner sig i har ett tidsbegränsat bygglov och övriga lokaler som de är evakuerade i är utdömda/har stora renoveringsbehov.

Lösning för Hummelstaskolan är svår att förutse då den är beroende av hur beläggningen av förskolan. Om de inte kan vara i förskolan kommer moduler och nybyggnation behövas för att kunna tillgodose behovet av platser. Vi har här även skicket av de permanenta moduler som står idag att ta hänsyn till. De kommer inte att kunna stå för alltid och behöver ses över på sikt.

8.2.3 Prioriteringar

Notera att prioritering mellan nämndernas åtgärdsförslag sker när lokalbehovsplanerna sammanställs till lokalförsörjningsplan och investeringsplan. Det innebär att vissa åtgärdsförslag kan senareläggas, andra kan utgå och åter andra behov kan föreslås mötas med en hyresvärdsupphandling i stället för byggnation i egenregi. Den slutliga planen är därför inte identisk med en summering av de åtgärdsförslag som respektive nämnd beslutat om som sitt planeringsunderlag. Särskilt i de planer som tas fram under 2026 kommer mer omfattande omprioriteringar att göras, utifrån det uppdrag som fullmäktige beslutade om hösten 2025 i sin årsplan (KS2025/189) att kommunens investeringar skulle sänkas med 30% under 2026 jämfört med föregående års investeringsplan.

1 Bilaga

Möjliga besparingsåtgärder med konsekvensanalys

En sammanställning av samtliga förvaltningars besparingsförslag.

2 Bilaga Markbehovsplan för utbildningsnämndens lokalförsörjning

Uppskattat markbehov per åtgärd är baserat på följande nyckeltal (per verksamhetstyp):

Förskola

- Byggnad: 12.5kvm/barn i två våningar
- Friyta: 40kvm/barn

Grundskola

- Byggnad: 12.5kvm/elev i två våningar
- Friyta: 30kvm/elev

ÅTGÄRD	BARN- /ELEVANTAL	YTBEHOV FRIYTA+TRANS PORT	YTBEHOV MARK, TOTALT
ROSENS FÖRSKOLA*	160	7400	9000
ENENS FÖRSKOLA*	160	7400	9000
TALLENS FÖRSKOLA*	160	7400	9000
NY GRUNDSKOLA **	1000	32000	40000

*Storleken visar på ungefärlig maximal tomtstorlek.

** Storleken visar på ungefärlig maximal tomtstorlek. Kapacitet visar på en skola för F-9. Beroende på vald lägesplacering kan tomtbehovet

delas upp i två storlekar, samt behöva inkludera storlek för sporthall (se lokalbehovsplan för upplevelseförvaltningen).
