

Utbildningsförvaltningen
Maria Jacobsson
0171-62623
maria.jacobsson@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Godkännande av förstudierapport samt beställning av byggnation för Bergvretenskolans kapacitetsökning samt utemiljö

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) beslutar att:

1. godkänna förstudierapporten och dess bilagor för Bergvretenskolans kapacitetsökning samt utemiljö, daterad 2024-03-22,
2. godkänna ökad driftkostnad enligt bifogad preliminär kalkyl gällande fastigheten Bergvreten 1:10, Bergvretenskolan, daterad 2024-03-14 (se bilaga 2),
3. föreslå kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut för ombyggnationen Bergvretenskolan på fastigheten Bergvreten 1:10 enligt förstudierapporten daterad 2024-03-22,
4. föreslå kommunstyrelsen att UAN:s driftbudget utökas med investeringens utökade driftkostnader (se bilaga 2).

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde 2023-02-02 en förstudie för att utreda kapacitetshöjande åtgärder på Bergvretenskolan samt dess utemiljö på fastigheten Bergvreten 1:10 (UAN2023/35, paragraf 21).

Denna förstudie är nu framtagen samt en preliminär kostnadskalkyl.

I den nybyggnation som föreslås kommer behovet för ca 1000 elevplatser i årskurs f-9 kunna tillgodoses.

Tanken är att den del där anpassad grundskola går idag rivs och ersätts med nya lokaler. I dessa lokaler är tanken att årskurs f-2 kan ha sin verksamhet samt ett rörelserum och ett makerspace (multifunktionsrum för slöjd, bild och teknik).


Denna kapacitetsökning kommer även kräva en ombyggnation av kök, matsal och några teorissalar i den befintliga skolan (UAN2022/1328) vilket kommer behöva

samorganiseras med denna ombyggnation. Båda ärendena kommer alltså behöva ett genomförandebeslut.

Investeringsmedel för denna investering finns med i kommunfullmäktiges beslutade årsplan för 2024 (KS2022/1040).

Utbildningsförvaltningens bedömning

Utbildningsförvaltningen ser ett behov av att kapacitetsöka skolan till ca 1000 elever samt se över utemiljön. Elevantalet ökar mer än vad prognosen säger. Redan nu har skolan ett elevantal på ca 800 elever. Skolan har idag paviljonger till sitt förfogande men bygglovet för dessa går ut våren 2030 och före dess behöver det finnas en permanent kapacitetsökning på plats då skolan är skyldig att ta emot elever i sitt upptagningsområde.

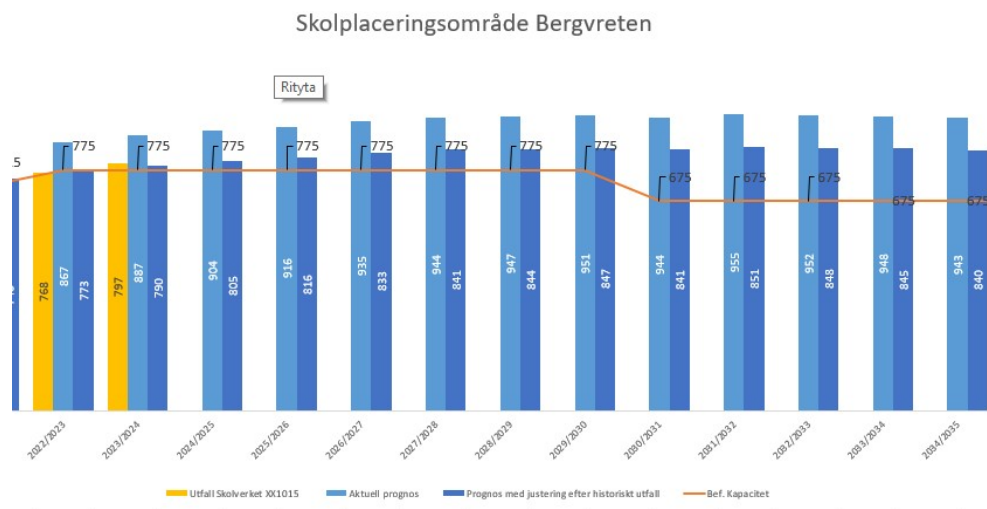

Förstudien har tittat på tre alternativ. I alternativ 1 har vi tittat på en organisation för ca 1000 elever i årskurs f-9.

Ett genomförande av denna byggnation samt dess utemiljö ser vi som ett alternativ utifrån den förstudie som gjorts och den preliminära kalkyl som tagits fram. Tanken är att bygga till en del där årskurs f-2 kan gå samt anlägga makerspace (multifunktionsal för slöjd, bild och teknik) och ett rörelserum. Även utemiljön ses över för att passa den föreslagna organisationen för 1000 elever.

Denna byggnation kommer kunna bidra till att vi kan skjuta en nybyggnation av en helt ny grundskola på framtiden. Det kommer också kunna bidra till att vi kan leva upp till kravet på ett fritt skolval.

Denna kapacitetsökning kommer även kräva en ombyggnation av kök, matsal och några teorissalar i den befintliga skolan (UAN2022/1328) vilket kommer behöva samorganiserars med denna ombyggnation. Båda investeringarna kommer alltså

behöva ett genomförandebeslut. Om vi inte gör denna ombyggnation kommer vi inte kunna tillgodose platser för delar av elever som redan går där eller de som spås gå där i framtiden. Även om vi bygger en ny grundskola tidigare än planerat så kommer vi inte kunna hänvisa befintliga elever på skolan dit då man ha rätt att gå kvar på sin skola.

I alternativ 2 har vi tittat på en organisation för ca 750 elever i årskurs f-9. Det som då behövs är en utbyggnad för förskoleklass. I det alternativet blir det svårt att hålla ihop övriga årskurser i lokalerna vilket kommer försvåra för verksamheten. Vi har även redan passerat antalet elever för den organisationen vilket inte möjliggör detta alternativ då befintliga elever har rätt att gå kvar på den skola de valt.

I alternativ 3 har vi tittat på en organisation för ca 700 elever i årskurs f-6. Detta skulle inrymmas i befintliga lokaler. Det kommer dock innebära att man inte kan hålla ihop årskurserna vilket försvårar för verksamheten. Det kommer även kräva att vi bygger ett nytt högstadium inom kort. Problematiken kvarstår att vi inte kan flytta på elever som redan går på skolan då de har rätt att gå kvar på den skola de valt så länge årskurserna erbjuds på skolan. Att bygga ett högstadium med alla dess specialsalar är kostsamt och vi behöver hitta kostnadseffektiva lösningar. Alla 3 alternativ kommer innebära en renovering av kök och en ombyggnation av matsal och vissa teorisalar. Storleken på den ombyggnaden varierar dock utifrån elevantalet i respektive alternativ.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Godkännande av förstudierapport samt beställning av byggnation för Bergvretenskolans kapacitetsökning samt utemiljö daterad 2024-03-14.

Förstudierapport daterad 2024-03-22 samt bilagor (bilaga 1, VBU kapacitetshöjning, bilaga 2 Lokalprogram kapacitetshöjning, bilaga 3 Volymkiss Ritningsförslag från Arkitekt, bilaga 4 Volymkiss Ritningsförslag från Landskapsarkitekt, bilaga 5 Preliminär Hyreskalkyl Bergvretenskolan)

UAN Kalkylunderlag Bergvreten kapacitetsökning

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Ulrika Björn
Administrativ chef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
Tekniska nämnden, för kännedom
