Tidplan
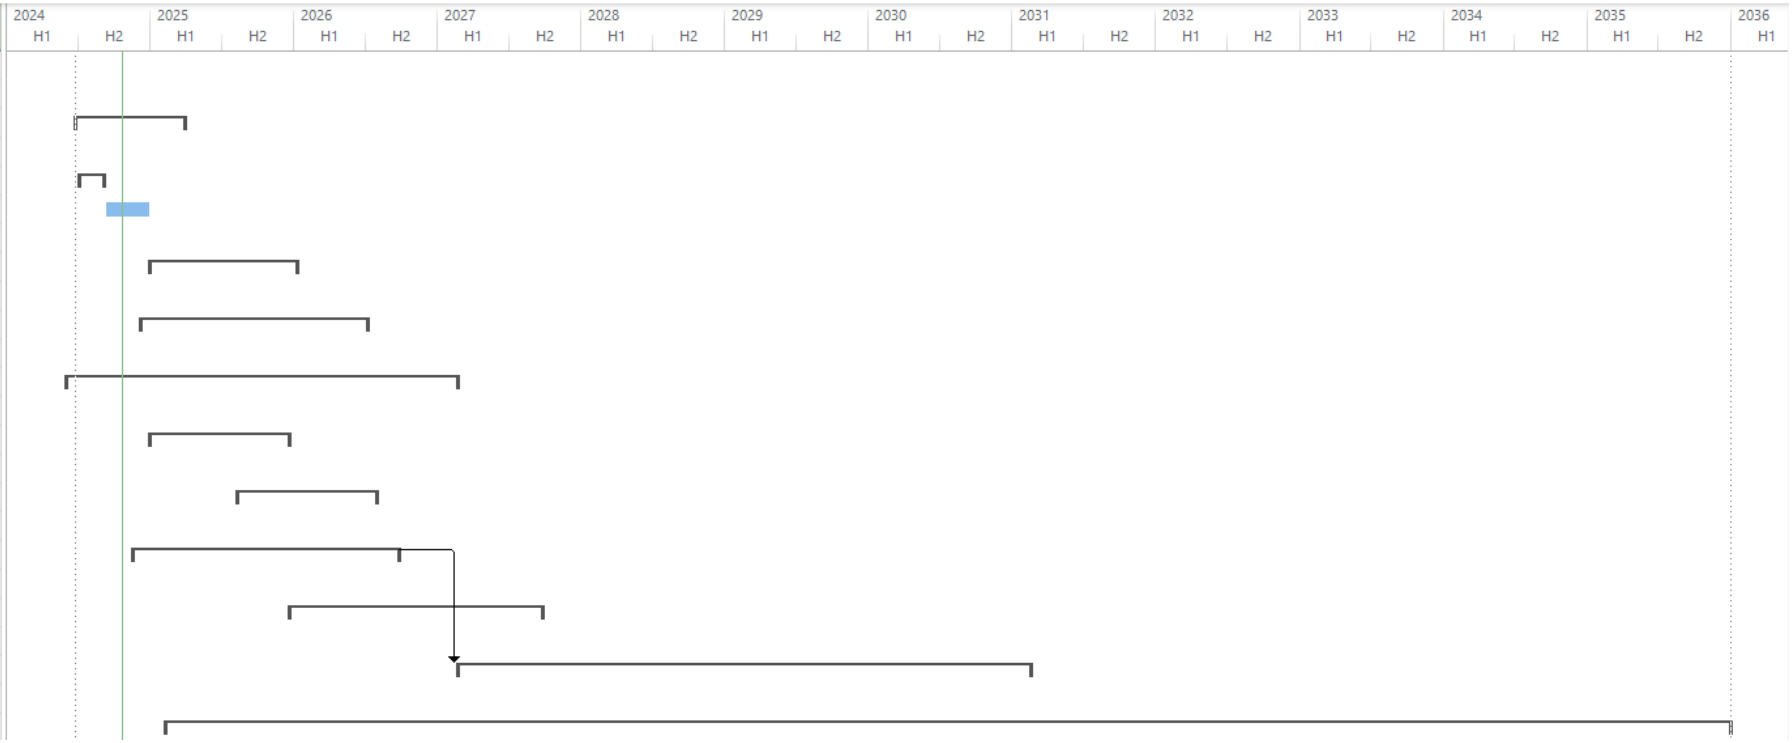
	Aktivitet	Varaktighe	Start	Slut
1				
2				
3	Komplettering förstudie	198 dagar	to 24-06-27	må 25-03-31
31				
32	Markförhandling	47 dagar	to 24-07-04	fr 24-09-06
35	Försening i markförhandling	80 dagar	må 24-09-09	fr 24-12-27
36				
37	Lantmäteriförrättning	270 dagar	må 24-12-30	fr 26-01-09
42				
43	Va-anslutning	412 dagar	må 24-12-09	ti 26-07-07
50				
51	Miljötillstånd	712 dagar	må 24-06-03	ti 27-02-23
94				
95	Detaljplan	256 dagar	må 24-12-30	må 25-12-22
106				
107	Projektering/FFU	255 dagar	må 25-08-11	fr 26-07-31
126				
127	Upphandling	485 dagar	må 24-11-18	fr 26-09-25
145				
146	Bygglov	459 dagar	ti 25-12-23	fr 27-09-24
163				
164	Byggnation inkl leveranstid	1040 dagar	on 27-02-24	ti 31-02-18
187				
188	Rivning och sanering	2842 dagar	må 25-02-10	ti 36-01-01
