


Utbildningsförvaltningen  
Elisabeth Ståhl

## Organisationsförändring – Kraftens förskola

### Behovsunderlag

Antal inskrivna i maj 2025 visar på 100 färre förskolebarn i Enköpings tätort än i maj 2024. Befolkningsprognos 2024 och barnprognosen för de kommande nio åren visar på en nedgång av antal förskolebarn för att sedan vända och öka igen 2029.

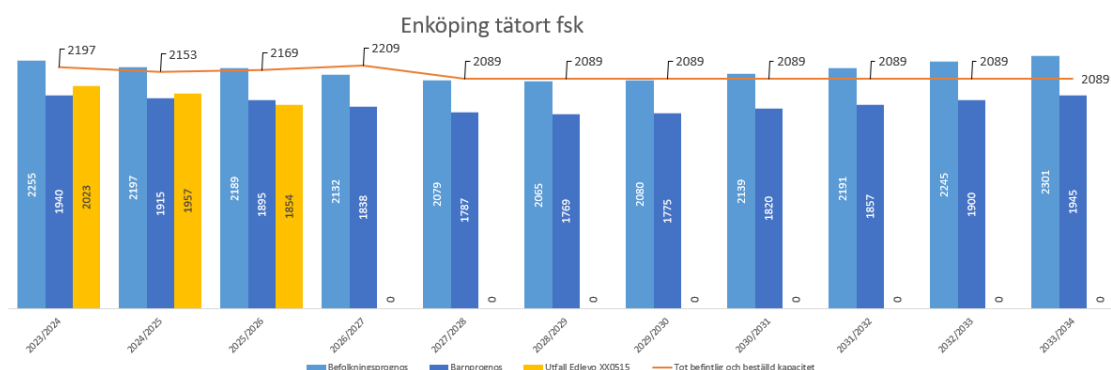

(Tabell hämtad 2025-07-03) Nuvarande befolkningsprognos och barnprognos för Enköping tätort: 2025 – 315 tomplatser, 2028 – 3720 prognosticerade tomplatser, 2031 – 232 prognosticerade tomplatser. Observera att inflytt till Enköping inte har varit i lika stor grad som prognosticerat vilket kan påverka befolkningsprognosen framöver, samt att flertalet förskolor har stora grupper som går till förskoleklass i höst vilket kan påverka barnprognosen. OBS! Kapaciteten visar 160 platser för typförskolorna.

Ett av de områden med störst minskning är Enöglas analysområde som minskade med 60 förskolebarn mellan 2024 och 2025. I detta område ligger de kommunala förskolorna Kraftens förskola, Enögla förskola och Sagogrändens förskola (ersätts av Ripans förskola vårterminen 2026) samt ett antal fristående aktörer. Övriga kommunala förskolor i de västra delarna av Enköpings tätort är Munkkällans förskola, Bolmörtens förskola, Gröngarns förskola samt Lärlingens förskola. Den kommunal förskola med störst minskning både i de västra delarna och i hela kommunen är Kraftens förskola.

Kraftens förskola ligger intill Enöglaskolan (ersätts av Lillsidanskolan 2026) och består av tre huskroppar som har renoverats löpande i större och mindre omfattning. Förskolan hade en


förskolebuss som avvecklades till sommaren 2025. Kapaciteten på förskolan är 110 förskoleplatser (132 inkl förskolebussen). Antal inskrivna på förskolan var i maj 2025, 78 barn och i augusti 54 inskrivna barn. Till hösten 2026 lämnar 15 barn för att börja förskoleklass.

## **Lokalplanering**

Lokalplaneringen i de västra delarna inkluderar ersättning och kapacitetsökning av Sagogrändens förskola till Ripans förskola till 2026, ersättning och kapacitetsökning av Enöglas förskola till 2030, samt renovering av Gröngarns förskola 2026 och Bolmörtens förskola 2027/2028.

För att minska kostnader för dyra evakueringslokaler, kunna säga upp inhyrda paviljonger samt möta den minskade barnprognosen bedömer utbildningsförvaltningen att Kraftens förskola kan avvecklas. Förskolans barn får en ersättningsplacering på Enögla förskola och Ripans förskola till höstterminen 2026. Ett ökat barnantal på både Enögla förskola och Ripans förskola kan innebära en flytt av personal till de förskolorna, men exakt behov och var Kraftens förskolas personal placeras kommer att utredas i senare skede.

Efter avvecklingen kan Kraftens förskolas lokaler användas som evakueringslokal 2026 för Gröngarns förskolas renovering, samt 2027-2030 som evakueringslokal för Enögla förskola under byggnationen för att kunna säga upp Enögla förskolas inhyrda paviljongerna. Vad lokalerna används till efter Enögla förskolas inflytt i nybyggnationen är ej bestämt, men det finns möjligheter både att starta upp en förskola igen för att kunna skjuta på ytterligare behov av ytterligare nybyggnation eller att använda lokalerna som avlastning för Lillsidanskolan.

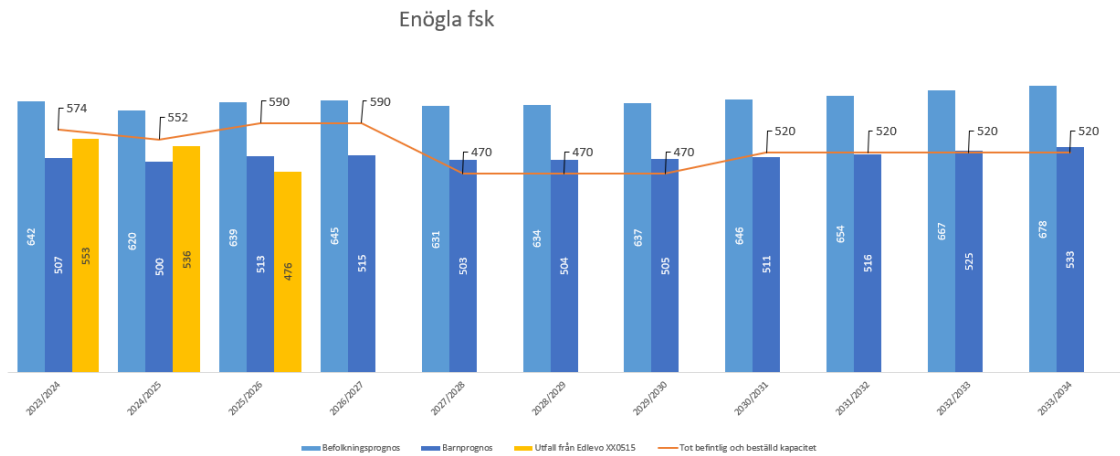

(Tabell hämtad 2025-07-03) Befolkningsprognos och barnprognos, Enögla analysområde: Ripans förskola står klar vårterminen 2026. Enögla förskola evakueras till Kraftens förskolas lokaler höstterminen 2027, och tillbaka i nybyggnation 2030. Kraftens lokaler står tomma från och med 2030.

OBS! Kapaciteten visar 160 platser för typförskolorna. På samma sätt som i tätorten så lämnar en stor grupp till förskoleklass 2025 vilket kommer att påverka barnprognosen nästa år om det inte skrivs inte lika många barn som lämnade.

TIDPLAN	FÖRSKOLA	
2025 HT	Kraftens förskola	Beslut avveckling lokaler
2026 VT	Sagogrändens förskola (Ripans förskola)	Inflytt i nya lokaler, kapacitetsökning
2026 HT	Kraftens förskola	Avveckling Kraftens förskola
	Gröngarns förskola	Evakuering på grund av renovering
2027 VT	Gröngarns förskola	Inflytt i renoverade lokaler
2027 HT	Enögla förskola	Evakuering under nybyggnation
		Uppsägning av inhyrda paviljonger
2030 HT	Enögla förskola	Inflytt i nybyggda lokaler

## **Ekonomiska konsekvenser**

Avvecklingen av Kraftens förskola innebär minskade kostnader för utbildningsförvaltningen vid uppsägning av exempelvis städavtal. Förändrade kostnader gällande personal utreds i senare skede.

Genom att kunna använda lokalerna som evakueringslokal under renoveringen av Gröngarns förskola försvinner behovet av utökade kostnader som behövs vid evakuering till exempelvis Storskogens förskolas paviljonger som har dyrare lokalhyra. Storskogens förskolas paviljonger kan då sägas upp efter att Storskogens förskola har flyttat in i sin nybyggnation sommaren 2026. Eftersom att utbildningsförvaltningen redan hyr lokalerna för Gröngarns förskola och Kraftens förskola blir det även en besparing av lokalhyran under renoveringsmånaderna. Hyran för Kraftens förskola är lite billigare än Gröngarns förskola.

Genom att kunna använda lokalerna som evakueringslokal under byggnationen av Enögla förskola kan Enögla förskolas inhyrda paviljonger sägas upp vilket innebär en besparing av den hyran och tillkommande lokalkostnader. Fördelen med att säga upp paviljongerna är att det blir en besparing för hela kommunen och de hamnar inte i lokalbanken så länge uppsägningen görs i tid med uppsägning av avtalet för paviljongerna.
